

UCPORI – muutostyöt 2026



VK 22


- Työmaa perustettu → Construction site established
- Suojaukset tehty → Protective measures completed
- 126 tilan purkutyöt käynnissä → Demolition works in room 126 are in progress
- Lohko 2 töiden valmistelut → Preparatory works for Block 2 underway.



Työmaa-alue on rajattu 123 Exam -tilan edustalle, ja kulkuovet on varustettu työmaa-alueesta ilmoittavilla opasteilla. → The construction site area has been cordoned off in front of Room 123 Exam, and the access doors have been equipped with construction site warning signs.



Työmaa-alue on rajattu lohko 2 osalta 101-käytävän ovelle. 100-aulan portaiden yläosa on muovitettu pölynhallinnan ja näkösuojauksen vuoksi. → For Block 2, the construction site area has been isolated up to the door of Corridor 101. The upper section of the stairs in Lobby 100 has been sealed with protective plastic sheeting for dust control and visual screening purposes.

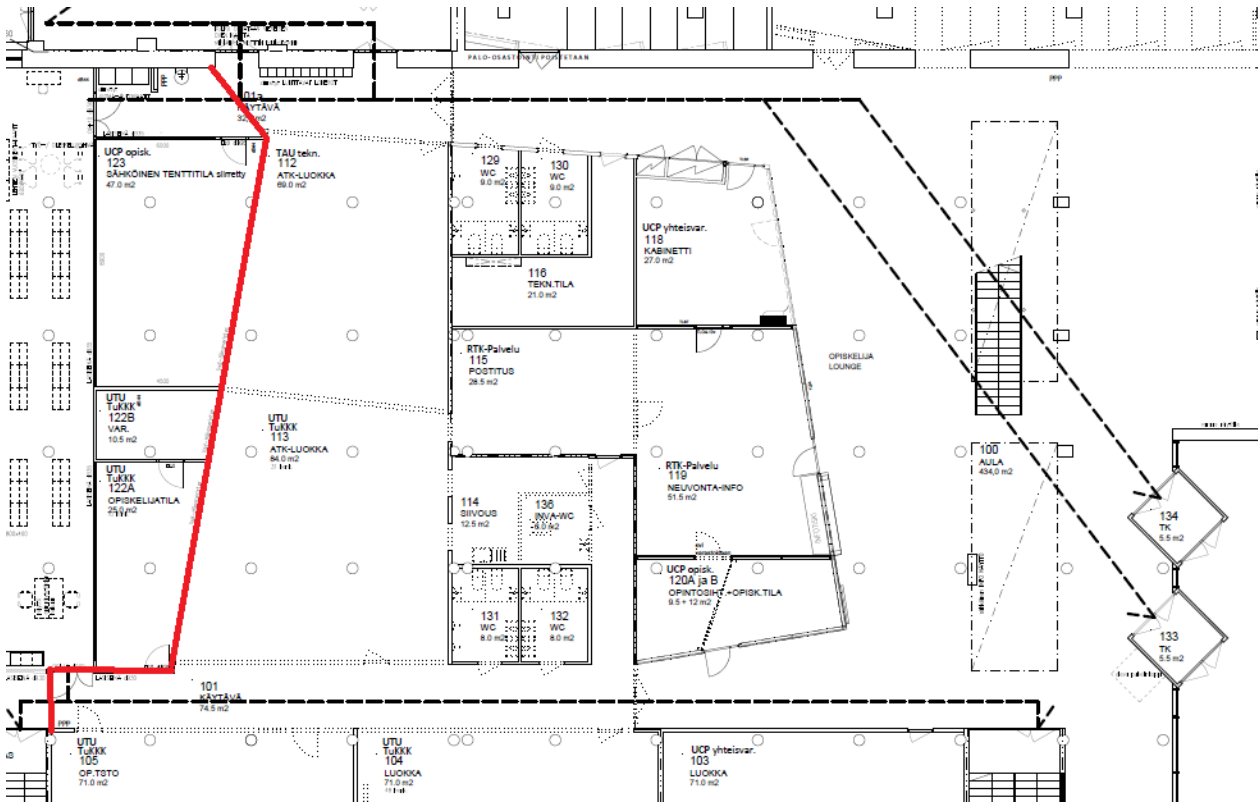

Kulku 123 Exam -tilaan on järjestetty kirjaston kautta. Toisen kerroksen käyttäjien kulku on järjestetty 106-porraskäytävän, kiinteistön hissien tai 103-tilan viereisen porraskäytävän kautta. → Access to Room 123 Exam has been arranged via the library. Access for second-floor users has been arranged through Stairwell 106, the building elevator, or the stairwell adjacent to Room 103.

VK 23 Tavoitteet – Objective

- 126 tilan tukikehikon purku → Demolition of the support frame structure in room 126.
- 126 tilan ikkunaseinän tiilipinnan näkyville otto → Exposure of the brick surface on the window wall in room 126
- Lohko 2 purkutöiden aloitus → Commencement of demolition works in Block 2.
