

Viikkotiedote viikko 25

Tampereen luokat L3 (248) ja L4 (251) eivät ole varattavissa ResourceBookerissa lohkon 6 muutostöiden aikana eli lokakuun puolesta joulukuun puoleen väliin saakka. Mikäli tiloihin tulisi tehdä varausblokin aikana varauksia, ota yhteys Tanja Palmrothiin.

Classes L3 (248) and L4 (251) in Tampere are not available for reservation in ResourceBooker during the alteration work of block 6, i.e. from mid-October to mid-December. If you need to make reservations for the facilities during the reservation block, please contact Tanja Palmroth. On campus, the Funet router will be moved from the third floor to the second floor between 20 and 24 July 2026, which will cause a complete interruption in connections for the day, the exact date will not be known until later. The network connection outage applies to all operators in UCPor.

Kampuksella tehdään Funet -reitittimen siirto kolmoskerroksesta kakkoskerrokseen 20. – 24.7.2026 välisenä aikana, mikä aiheuttaa yhteyksien täyskatkon päivän ajaksi, tarkempi päivä selviää vasta myöhemmin. Verkkoyhteyksien katko koskee kaikkia toimijoita UCPorissa.

On campus, the Funet router will be moved from the third floor to the second floor between 20 and 24 July 2026, which will cause a complete interruption in connections for the day, the exact date will not be known until later. The network connection outage applies to all operators in UCPor.

UCPORI – muutostyöt 2026




VK 24

- 125 tilan penkit sekä muovimatot purettu → The seating and vinyl flooring in Room 125 have been removed.
- 126 tilan lattian betonivalu työ suoritettu → Concrete floor casting works in Room 126 have been completed.
- 129/130 wc tilojen purkutyö käynnissä → Demolition works in the WC facilities of Rooms 129 and 130 are in progress.



126 tilan lattiavalu työt suoritettu. Pinta on muovitettu. → Floor casting works in Room 126 have been completed. The concrete surface has been covered with plastic sheeting for curing.

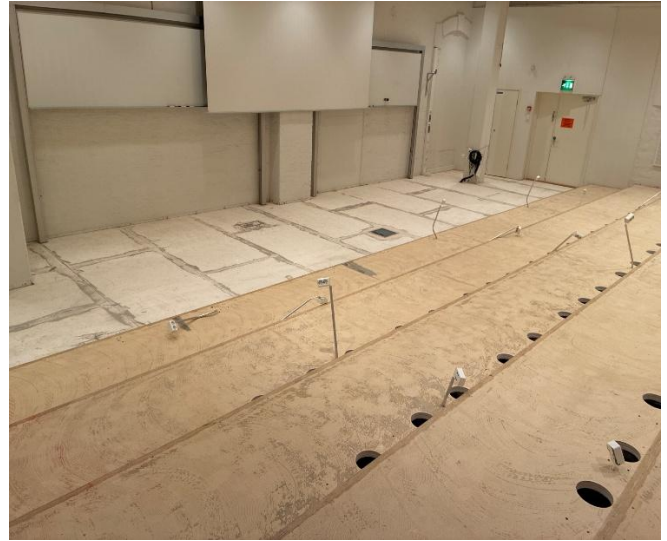

125 tilan penkkien, muovimattojen purkutyö suoritettu. → The demolition of the seating and vinyl flooring in Room 125 has been completed.



Yleinen siisteys työmaalla hyvä. Ensimmäinen nostin saapunut työmaalle. → The overall site cleanliness remains at a good level. The first mobile elevating work platform has been delivered to the site.

VK 25 Tavoitteet – Objective

- 126 tilan muovinpoisto, pinnan hiominen. → Removal of the protective plastic sheeting and surface grinding in Room 126.
- Sähköurakoitsija aloittaa purkutyöt 15.6 → The electrical contractor will commence demolition works on 15 June.
- 129/130 wc tilojen purkutyön valmistuminen. → Completion of demolition works in the WC facilities of Rooms 129 and 130.
- Lohko 2 muovimattojen poistaminen sekä seinien purkutyön aloittaminen. → Commencement of vinyl flooring removal and wall demolition works in Block 2.
