

UCPORI – muutostyöt 2026



VK 27

- Väliseinä urakoitsija on aloittanut työnsä (Kulorak Oy) → The partition wall contractor (Kulorak Oy) has commenced its works.
- Wc tilat 129/130 levytystyöt käynnissä → Board installation works are in progress in WC rooms 129/130.
- Purkutyöt lohkoista 1-2 90 % valmiina → Demolition works in Blocks 1 and 2 are approximately 90% complete.
- Sähkötöiden asennukset alkaneet lohko 1 tiloista → Electrical installation works have commenced in Block 1.



wc tilojen 129/130 levytystyö käynnissä → Board installation works are in progress in WC rooms 129/130.




125 tilan valaistuskiskojen asennustyö käynnissä, 126 tilan tiilipinnan näkyville oton lopputulos → Installation of the lighting track system is in progress in Room 125, Final result of the exposed brick wall surface in Room 126.




119/120 tilojen lattiapinnat valmiina pohjatöihin ja tekstiililaatan asennukseen → Floor surfaces in Rooms 119/120 are prepared and ready for substrate works and carpet tile installation.

Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

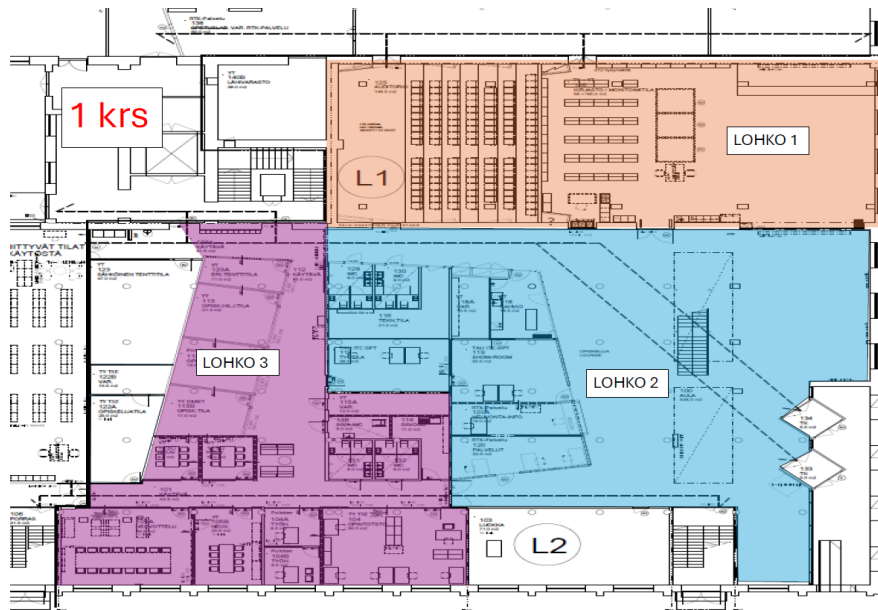

1.krs purkukuva → 1st floor demolition layout

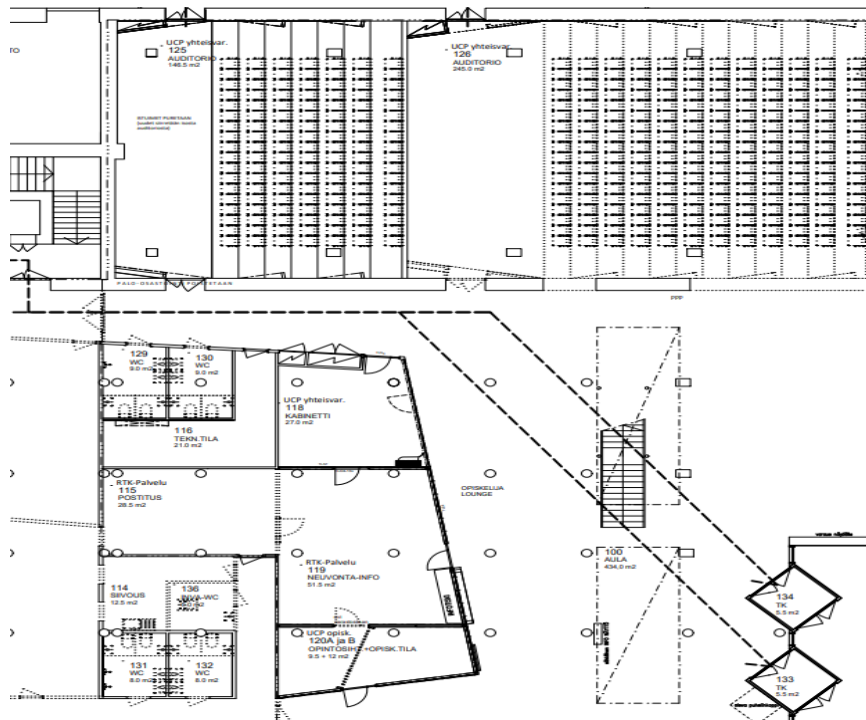

VK 28 Tavoitteet – Objective

- Maalausurakoitsija aloittaa työnsä, (Maalausliike Ar Oy) → The painting contractor (Maalausliike Ar Oy) will commence work on site.
- Purkutyöt tavoitteena saada valmiiksi lohkoista 1-2 → Demolition works in Blocks 1 and 2 are targeted for completion.
- Väliseinätyöt alkavat sekä 126 tilan tarvittavat kotelointityöt → Partition wall works and the required boxing-in works in Room 126 will commence.
