


UCPORI – muutostyöt 2026



VK 28

- Tasoitus- ja maalaustyöt alkaneet 126 tilasta → Plastering and painting works commenced in Room 126
- Kipsikotelointi työ suoritettu lohko 1-2 → Gypsum board bulkhead installations were completed in Blocks 1–2
- Väliseinätyöt käynnissä 119 ja 115 tiloissa → Partition wall installation is ongoing in Rooms 115 and 119
- Purkutyöt suoritettu lohko 1-2 → Demolition works have been completed in Blocks 1–2
- Laatoitusurakoitsija valittu ja aloittanut työnsä 129/130 wc tiloista → The tiling subcontractor has been appointed and commenced works in the WC facilities (Rooms 129–130)

- Sähkötyöt käynnissä lohko 1-2 → Electrical installation works are ongoing in Blocks 1–2
- Työmaapalvelu valaissut työmaan led nauhoilla sekä led valaisimilla → The site logistics contractor has improved temporary site lighting by installing LED strip lighting and LED luminaires

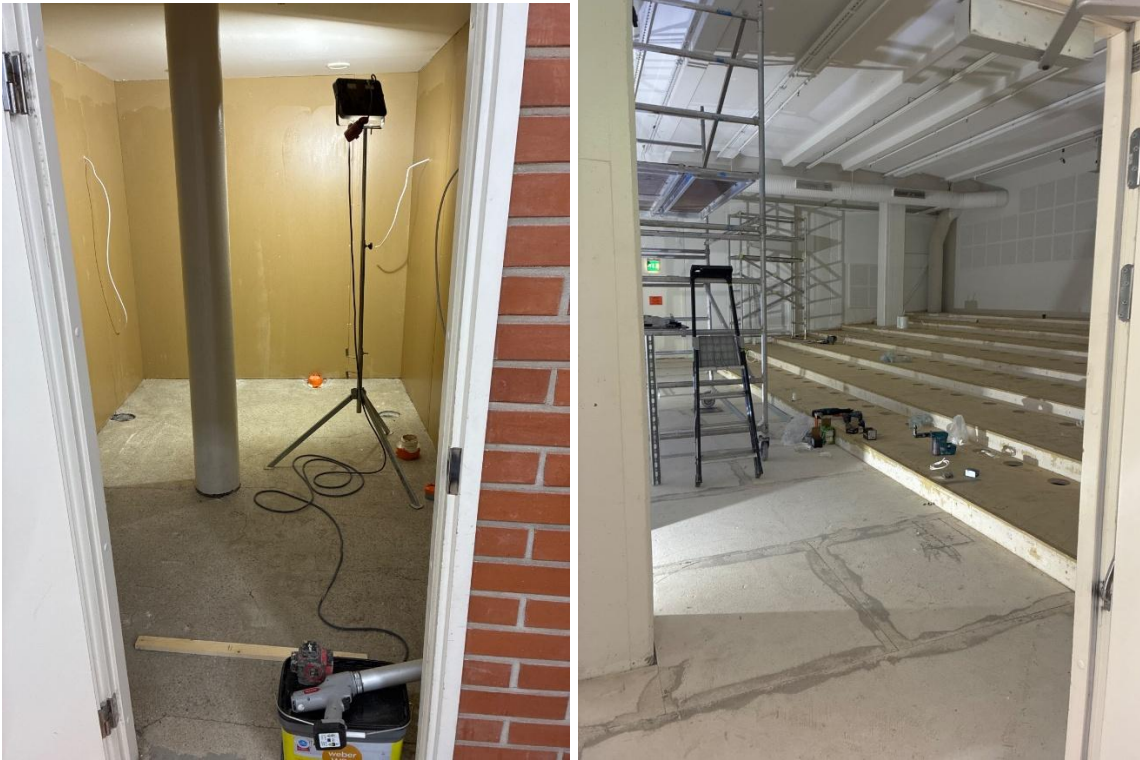


129 wc tilan pohjatöiden valmistelut käynnissä, tartunta-aine primer levitetty. 125 Auditoriossa sähkötyöt käynnissä → Substrate preparation works are ongoing in WC Room 129; the primer coat has been applied. Electrical works are ongoing in the Auditorium (Room 125)



126 tilassa maalausta edeltävät suojaukset suoritettu, (muovitus sekä sprinklerien suuttimet suojattu foliolla). Maalaustyö käynnissä katon ja seinien osalta. → Pre-paint protection works have been completed in Room 126, including masking with polyethylene sheeting and protecting sprinkler heads with foil. Painting of the walls and ceiling is currently in progress



Kuva 1

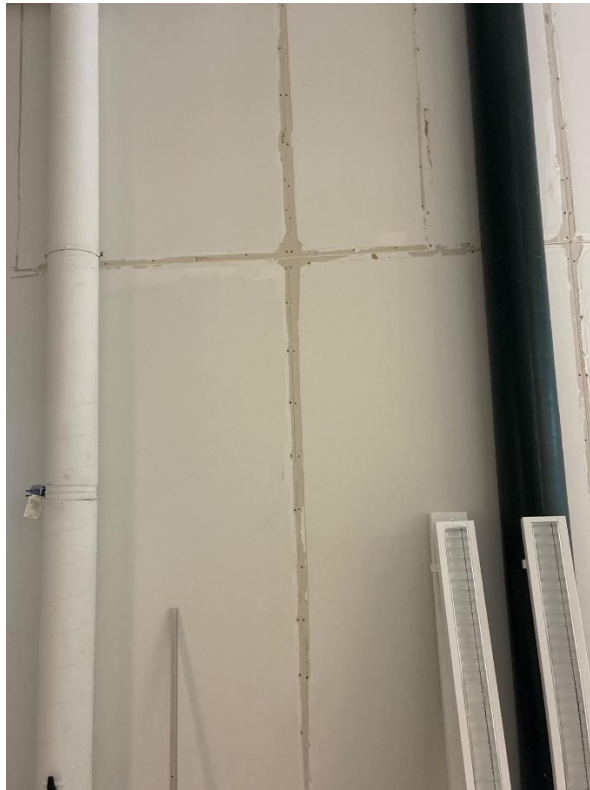

Kuva 2


Tilojen 119-120A välisen väliseinän levytystyö käynnissä. Ääneneristävyys arvona min. dB 44 (Kuva 1) → Plasterboard installation of the partition wall between Rooms 119 and 120A is ongoing. The partition is designed to achieve a minimum airborne sound insulation rating of 44

Olemassa olevien kipsiväliseinien saumojen korjaus. Vanhat nauhat huonosti kiinni saumoissa, poistetaan ja uusitaan (kuva 2) → Repairs to the joints of the existing gypsum board partition walls are in progress. Existing joint tapes exhibiting poor adhesion are being removed and replaced (see Figure 2)




Työmaalla yleinen puhtaus hyvä. Pölynhallinta ja suojaukset tehty ohjeiden mukaan. → The site is clean and well maintained. Dust control measures and protective coverings have been implemented in accordance with the project requirements.

Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

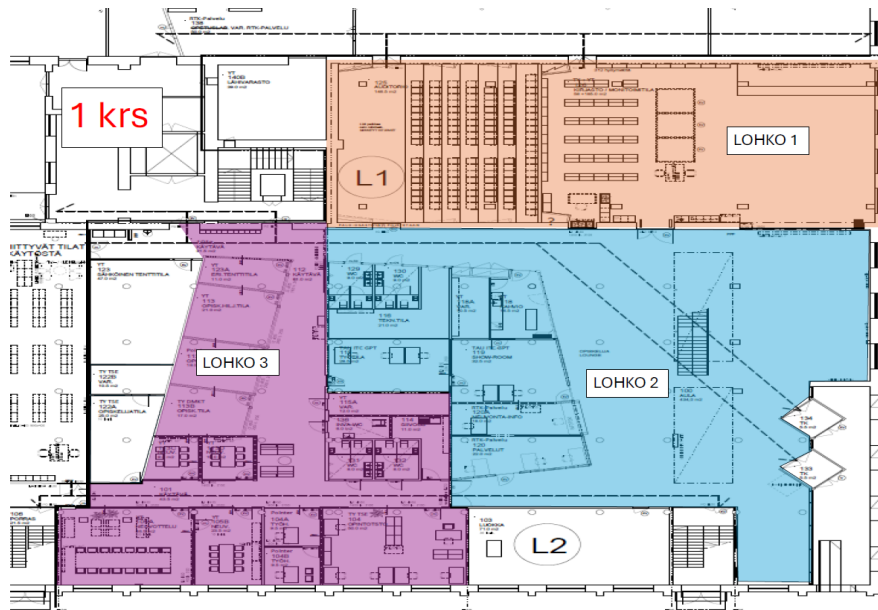

1.krs purkukuva → 1st floor demolition layout

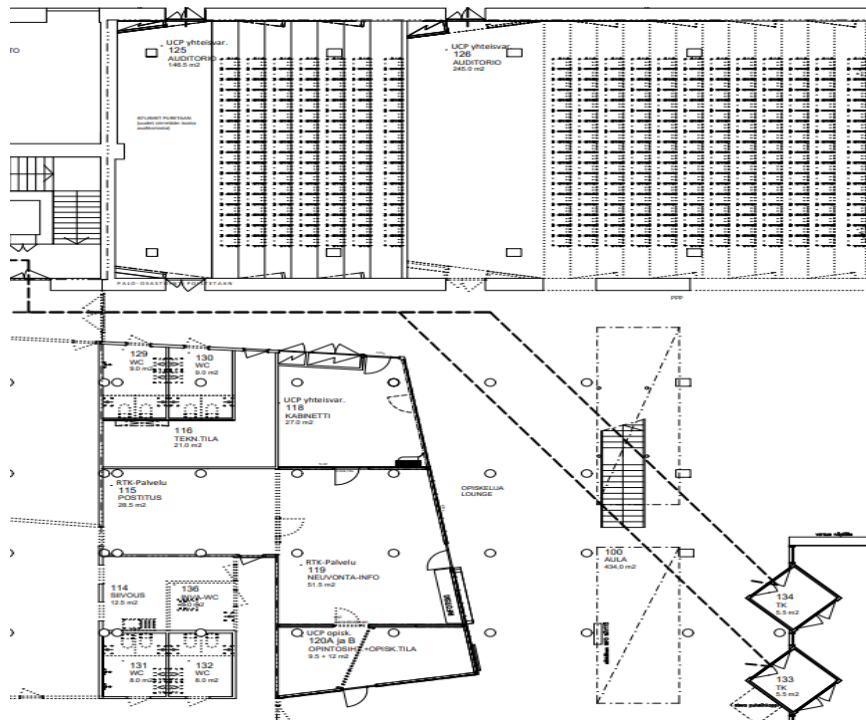

VK 29 Tavoitteet – Objective

- 126 Monitoimitila/Kirjasto maalaustöiden valmistuminen → Completion of painting works in the Multi-purpose Room/Library (Room 126).
- Väliseinätyön valmistuminen lohko 2 → Completion of partition wall installation works in Block 2.
- Maalaustyön jatkaminen 125 tilaan sekä lohko 2 osiin. → Continuation of painting works in Room 125 and selected areas of Block 2.
- Valaisin kiskojen asennus, valaisimien huolto sekä lohko 2 kaapelointi jatkuu → Installation of lighting tracks, maintenance of light fixtures, and continuation of cable installation works in Block 2.
