

## UCPORI – muutostyöt 2026



### VK 29

- Tasoitus- ja maalaustyöt valmistuvat 125 auditoriossa ja 126 kirjasto/monitoimitilassa → Finishing and painting works to be completed in Room 125 (Auditorium) and Room 126 (Library/Multi-purpose Space).
- Väliseinätyöt lohko 2 valmistuvat 17.07 mennessä → Partition wall installation works in Block 2 to be completed by 17 July.
- Valaisin kiskot asennettu 125 tilaan, asennukset jatkuvat 126 tilassa → Lighting tracks have been installed in Room 125; installation works will continue in Room 126
- Valaisimet saapuvat työmaalle 1-2 lohkoihin → Light fittings for Blocks 1 and 2 are scheduled for delivery to site

- Kipsiseinien nauhoitus ja huoltomaalaukset lohko 2 → Joint taping of gypsum board walls and maintenance painting works will continue in Block 2
- Lohko 3 virallinen pääsy. Suojaukset huolellisesti → Official access to Block 3 will be granted. All protection measures must be installed and maintained carefully.



*Kuva 2*



*Kuva 1*

126 tilan seinät, katto sekä tekniikka maalattu (kuva 1). 125 tilan seinät ja katto huoltomaalattu (kuva 2) → Room 126: The walls, ceiling, and exposed MEP services have been painted (Figure 1). Room 125: Maintenance painting of the walls and ceiling has been completed (Figure 2).



120 A / 119 tilan välinen väliseinä, reunat kierretään joustavalla massalla äänieristävyyteen varmistamiseksi → The perimeter of the partition wall between Rooms 120A and 119 is being sealed with a flexible acoustic sealant to ensure the required sound insulation.



Johtojen ja putkien läpiviennit tiivistetään massalla → Cable and pipe penetrations are sealed with sealant to ensure airtightness and acoustic performance.




Poistoilmaventtiilit ovat teipattu estääkseen mahdollisen pölyn kulkeutumisen kanavistoon. → The exhaust air vents have been taped over to prevent dust contamination of the ventilation ductwork during construction




Siisteys aidatulla alueella hyvä. → The fenced site area is clean and well maintained.



## Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

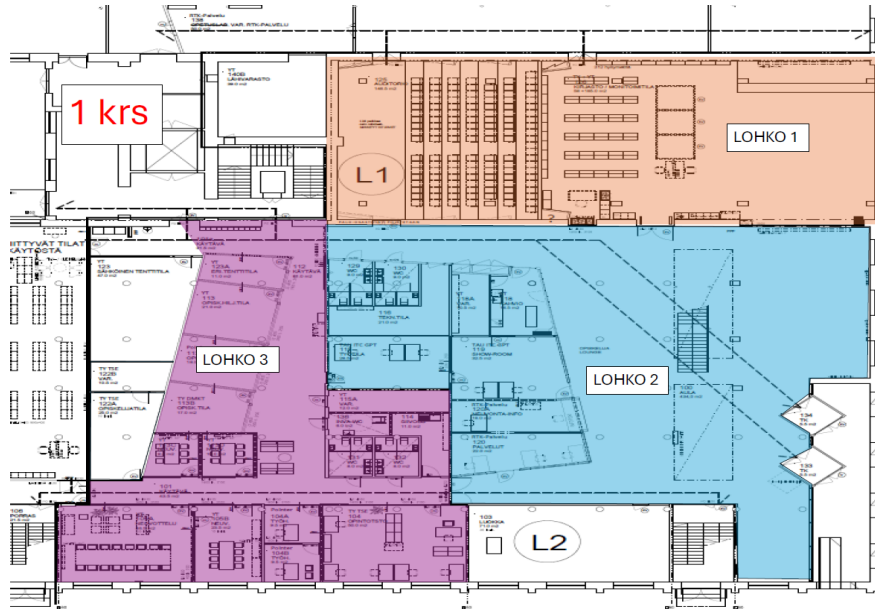

## 1.krs purkukuva → 1st floor demolition layout

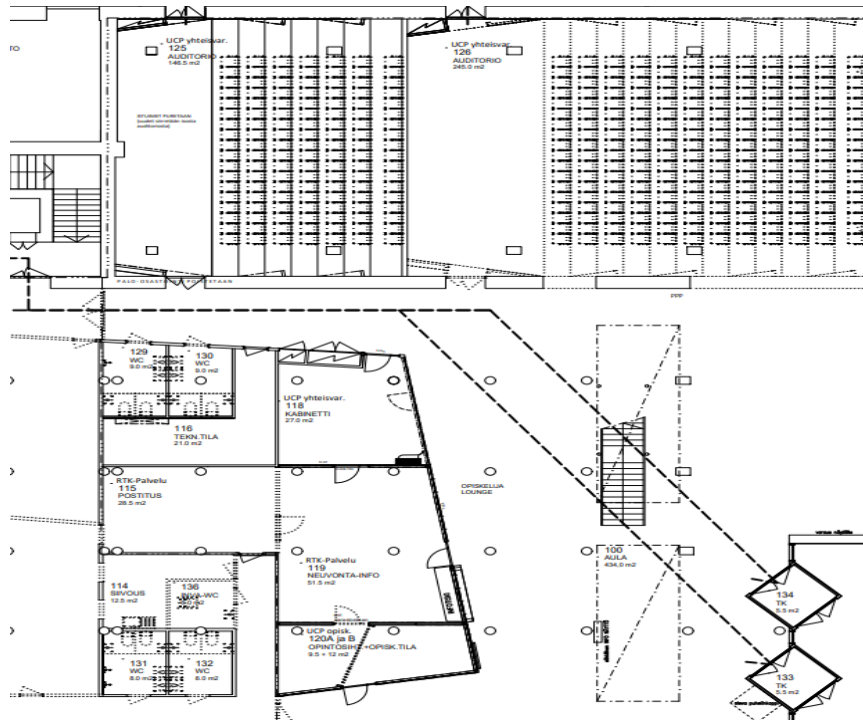

## VK 30 Tavoitteet – Objective

- Lohko 3 purkutyöt → Demolition works will commence in Block 3.
- 126 tilan lattian tasoitustyö → Floor levelling works will commence in Room 126
- Valaisimien asennustyö 125/126 tiloihin → Installation of light fittings in Rooms 125 and 126
- 129/130 wc tilojen laatoitus → Wall and floor tiling works in WC Rooms 129 and 130
- Väliseinien tasoitus – ja maalaustyöt sekä huoltomaalaus → Partition wall skim coating, painting, and maintenance painting works.
- Väliseinien aloitus lohko 3 → Partition wall installation will commence in Block 3
