


UCPORI – muutostyöt 2026



VK 31

- 126 kirjasto/monitoimitilan lattia-tasoitus → Floor levelling completed in the Library/Multipurpose Room (126)
- 125 auditorion induktiosilmukan asennus → Installation of the induction loop system completed in the Auditorium (125)
- 129/130 wc tilojen lattia-la^{at}at saapuneet → Floor tiles for WC rooms 129/130 delivered to the site.
- Lohko 3 purkutyöt valmistuneet → Demolition works completed in Block 3.
- Lohkojen 1-2 tekstiilila^{at}at saapuneet työmaalle → Carpet tiles for Blocks 1–2 delivered to the site.

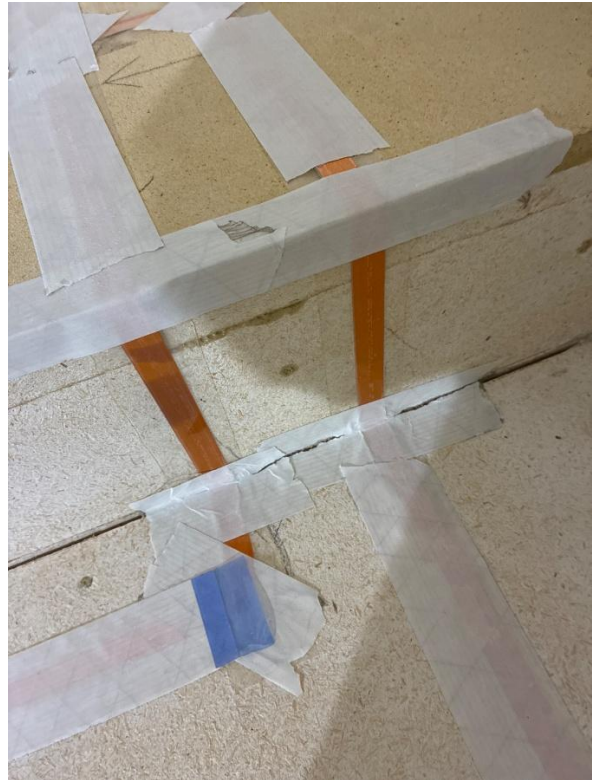

125 tilan induktiosilmukan asennustyö käynnissä → Installation of the induction loop system in Room 125 is in progress



126 tilan lattiaantasoitus työ käynnissä → Floor levelling works are in progress in Room 126




131/132 wc tilat purettu. Sähkö- ja levytystyöt tehty. → WC rooms 131/132 have been demolished. Electrical and drywall installation works have been completed




101 A sekä 101 käytävän palo-oville tulevat aukotukset tehty. Rungon teko käynnissä →
Openings for the fire doors in Corridor 101A and Corridor 101 have been completed, and
framing works are ongoing.

Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

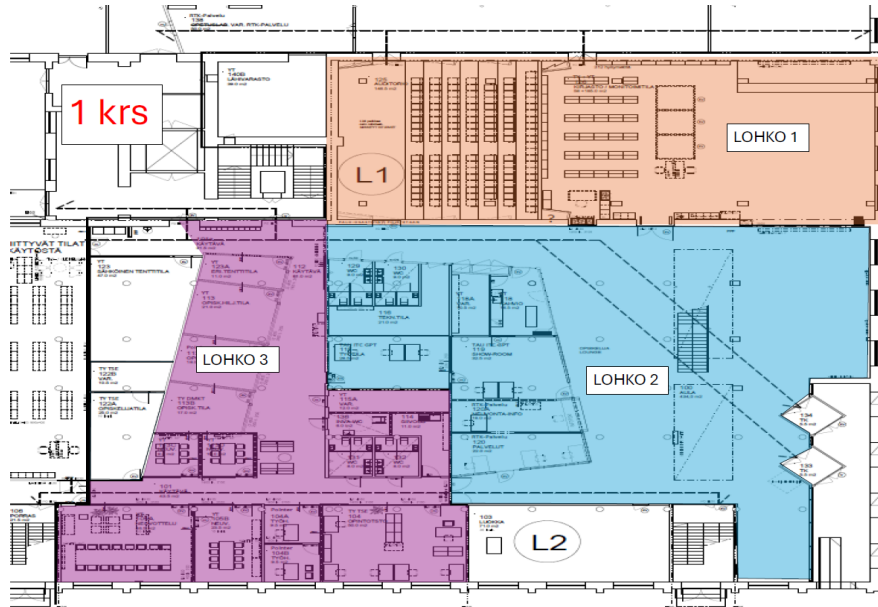


1.krs purkukuva → 1st floor demolition layout

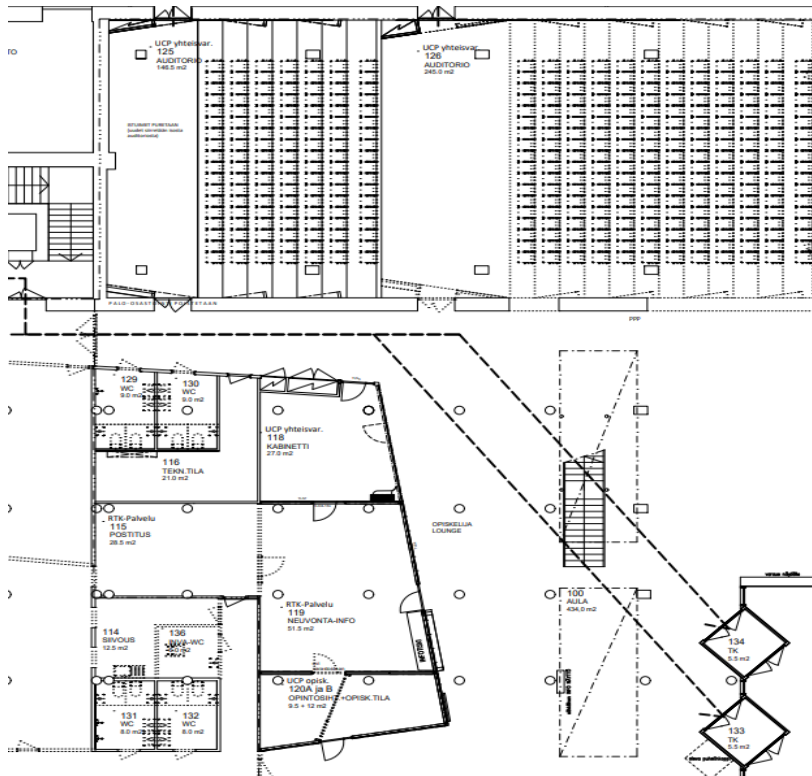



1.krs purkukuva → 1st floor demolition layout

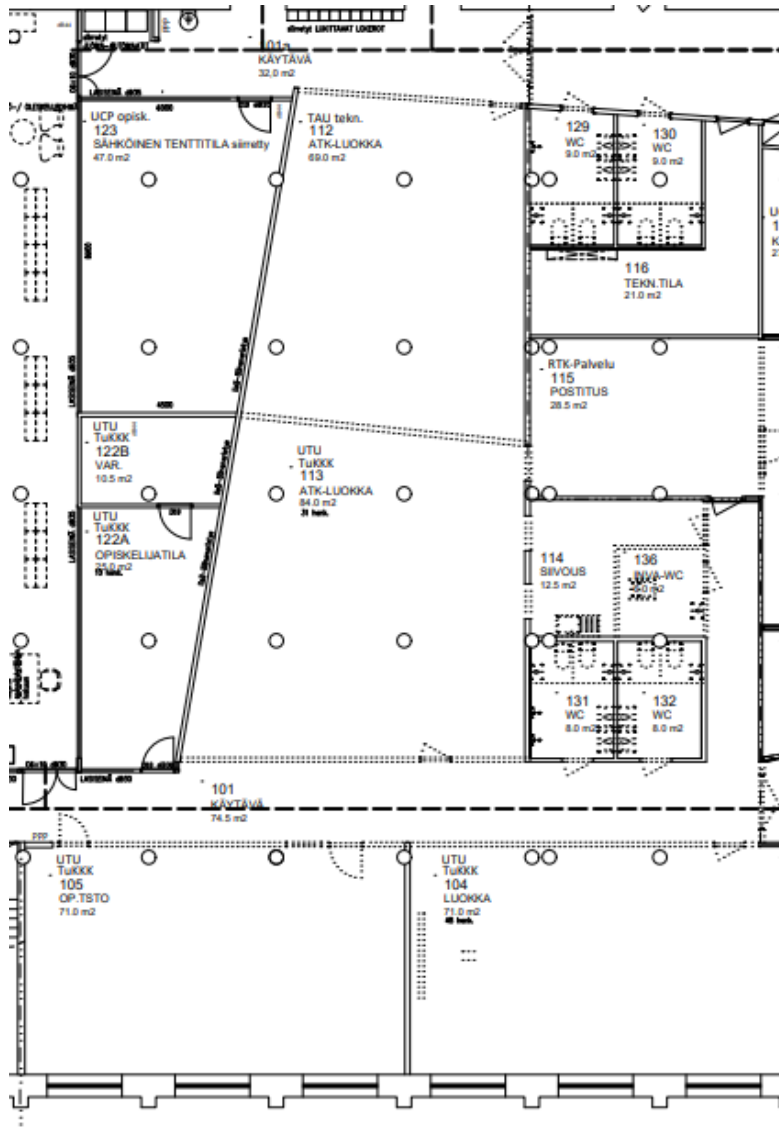

VK 32 Tavoitteet – Objective

- Lohko 3 väliseinien työt jatkuvat → Partition wall works continue in Block 3.
- lohkot 1-2 tasoitetyöt sekä tekstiililaatan asennus → Floor levelling works and carpet tile installation continue in Blocks 1–2.
- 125 auditorion penkkien asennus → Installation of the auditorium seating in Room 125
- tekstiililaattojen suojaus → Protection of the newly installed carpet tiles.
- 129/130 wc tilojen laatoitus → Tiling works continue in WC rooms 129/130.
- Kattovalaisimien asennus → Installation of ceiling-mounted light fixtures
