


UCPORI – muutostyöt 2026



VK 32

- 125 auditorion tekstiililaatan asennus, listoitus. Valaistuksien asentaminen → 125 auditorium carpet tile installation, skirting installation, and lighting installation.
- 126 kirjaston induktiosilmukan ja tekstiililaatan asennus → 126 library induction loop system and carpet tile installation.
- Lohkon 2 ja 3 välinen palo-osastoinnin tuplalevytyks. Palo-ovien aukotuksien teko → Double plasterboard installation to the fire compartment wall between Blocks 2 and 3, and formation of openings for fire-rated doors.
- Lohko 3 väliseinätyöt jatkuvat → Partition wall installation works continue in Block 3.

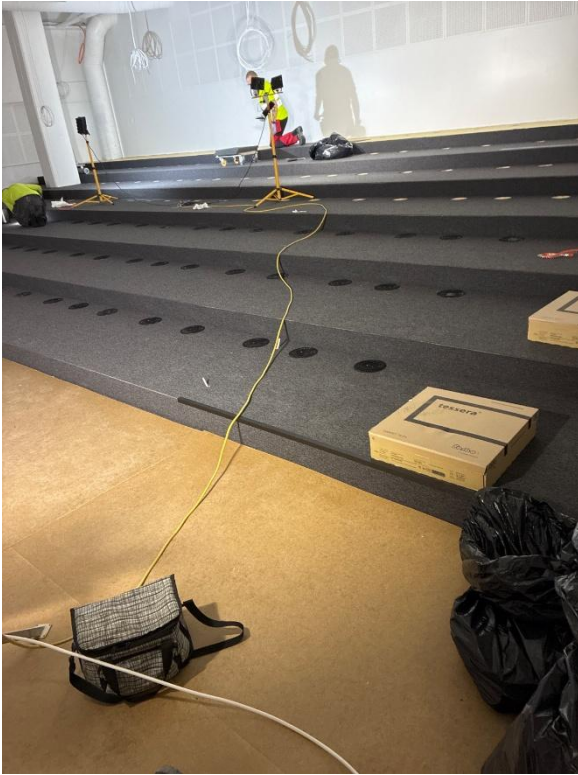

125 tilan tekstiililaatan asennus sekä ilmanvaihtoventtiilien → 125 area carpet tile installation and ventilation grille installation.

125 tilan valaistuksen asennus käynnissä → Lighting installation is ongoing in room 125.



126 tilan lattian tasoitus työ tehty → Floor levelling in room 126 has been completed.




126 tilan induktiosilmukan asennus käynnissä
→ Induction loop system installation is ongoing in room 126




Patterien asennus käynnissä 126 tilaan → Heating radiator installation is ongoing in room 126.

100 aulan alapohjan vanhojen rakennusjätteiden siivous työ käynnissä → Removal of old construction debris from the ground floor void in the 100 lobby is ongoing.


Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

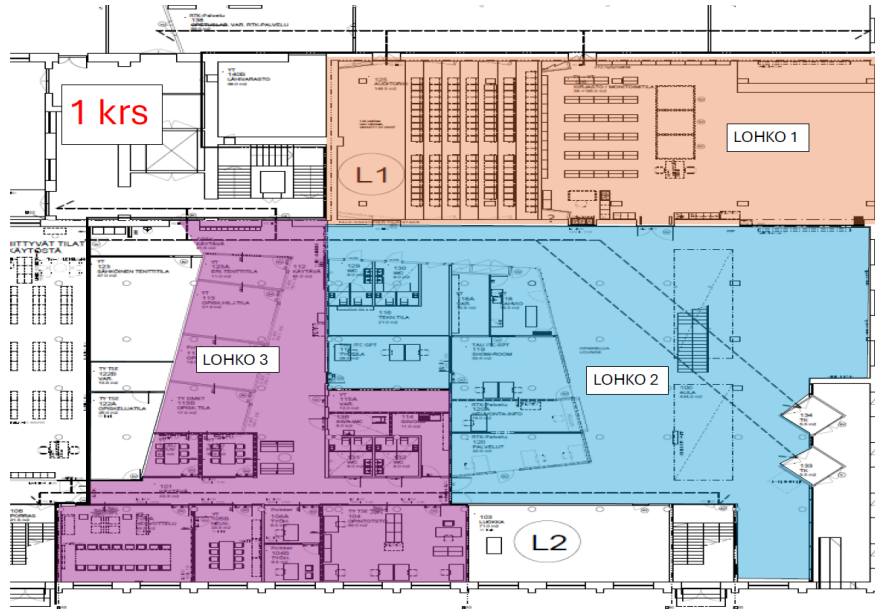

1.krs purkukuva → 1st floor demolition layout

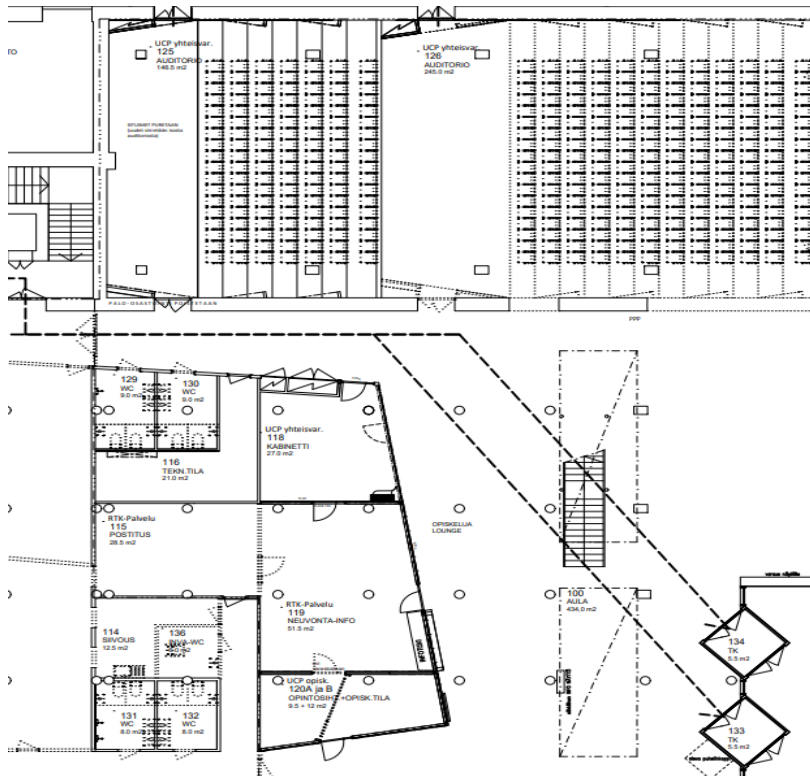

1.krs purkukuva → 1st floor demolition layout

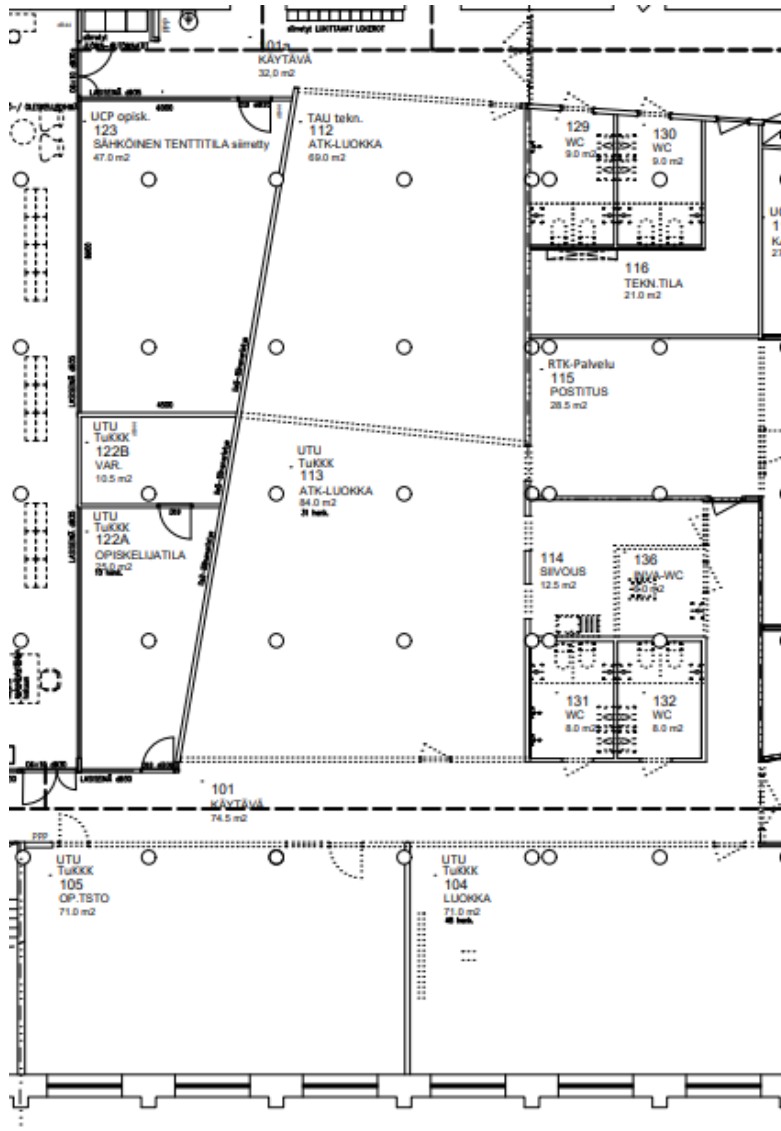

VK 33 Tavoitteet – Objective

- 125 tilan ja 126 viimeistelytyöt → Finishing works in rooms 125 and 126.
- 100 aulatilán lattiasuojien poisto ja huolellinen laattapintojen syväpuhdistus → Removal of floor protection in the 100 lobby area and thorough deep cleaning of the tiled floors.
- Lohkon 2 tasoite ja mattotyöt → Floor levelling and flooring works in Block 2.
- 129/130 wc tilojen laatoitus → Tiling works in WC rooms 129/130.
- Lohko 3 väliseinätöiden jatkuminen → Partition wall installation works continue in Block 3.
- Lohko 4 aukeaminen työmaa-alueeksi maanantai 10.8 → Block 4 will be opened as a construction work area on Monday, 10 August.
- Valaistuksien asentaminen 1-2 lohkoille → Lighting installation in Blocks 1 and 2.
