



UCPORI – muutostyöt 2026

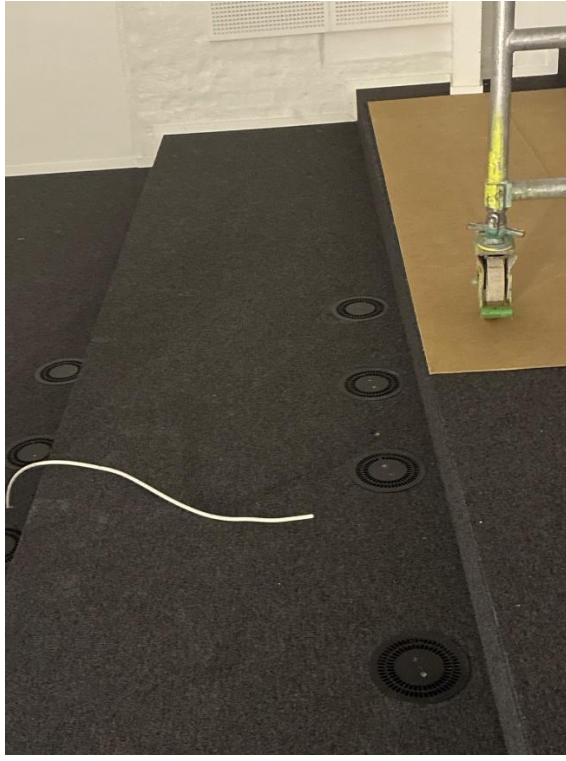

VK 33

- Lohko 1-2 tekstiililaattojen asennukset valmistuvat → Completion of textile tile installation in Blocks 1–2
- Lohko 1-2 valaistuksien asennus → Completion of lighting installations in Blocks 1–2
- 125 auditorio penkkien/pöytien asennus → Installation of seats and tables in Auditorium 125
- Lohko 3 väliseinät jatkuvat → Partition wall works continue in Block 3
- Lohko 4 työmaa-alue rajattu, purkutyöt lähtenyt käyntiin → Block 4 construction area secured, demolition works commenced.

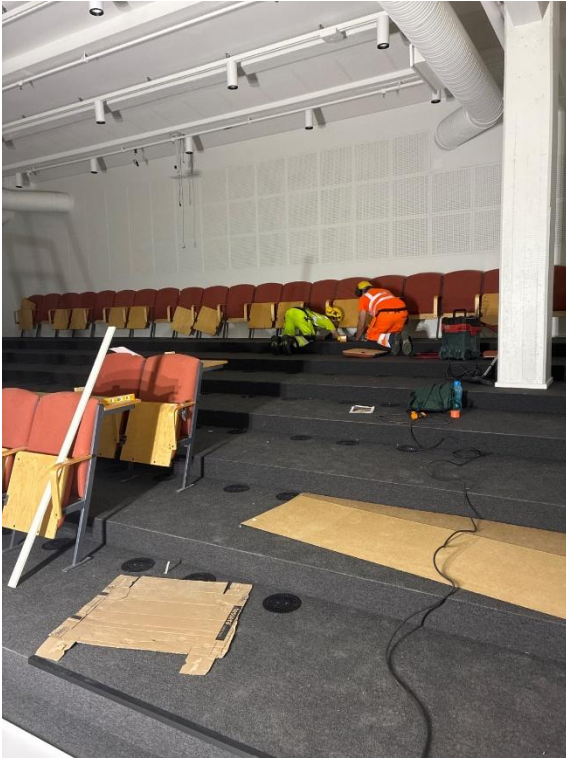

125 auditorion penkkien asennustyöt käynnissä. Valaistukset asennettu ripustuskiskoihin →
Installation of seating in Auditorium 125 is ongoing. Lighting fixtures have been installed on the suspension rails.



126 kirjastotilaan asennettu tekstiililaatta ja suojattu. Valaisin asennukset käynnissä →
Textile tiles have been installed and protected in Library 126. Lighting installation is ongoing.




119 tilaan asennettu valaistukset ja jäähdytyskonvektorit → Lighting fixtures and cooling convectors have been installed in Room 119.

120A/120 tiloissa käynnissä tekstiililaatan asennus sekä ikkunapinnoista teippien poisto → Textile tile installation and removal of protective tape from window surfaces are ongoing in Rooms 120A/120.




Lohko 4 työmaa-alue rajattu → Block 4 construction area secured.

Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

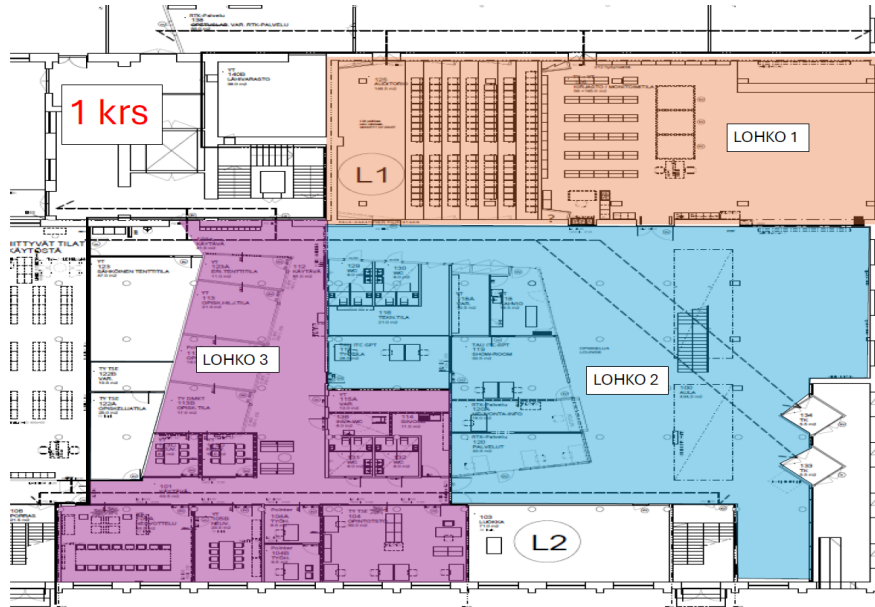


1.krs purkukuva → 1st floor demolition layout

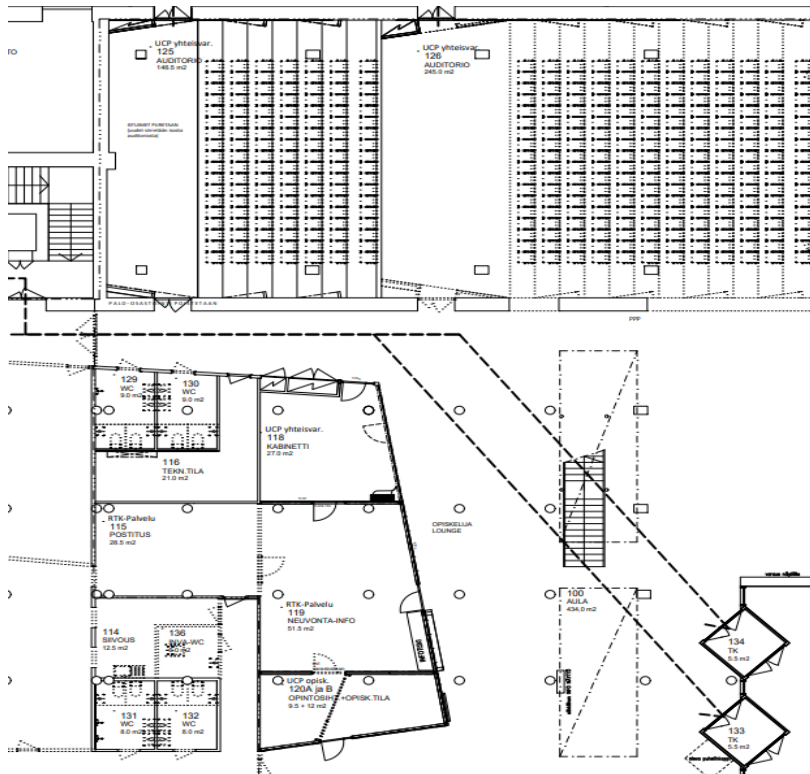




1.krs purkukuva → 1st floor demolition layout

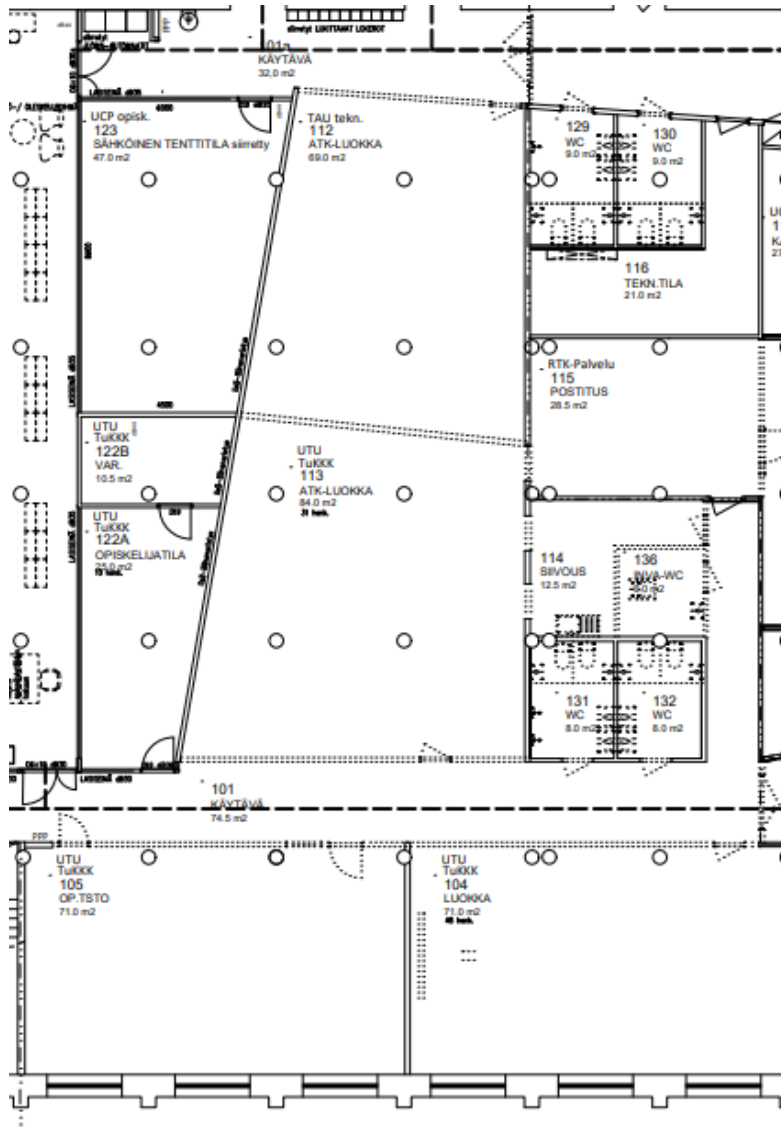



Lohko 4 työmaa-alue → Block 4 working area

lohko 4 aikataulu; 10.08-09.11

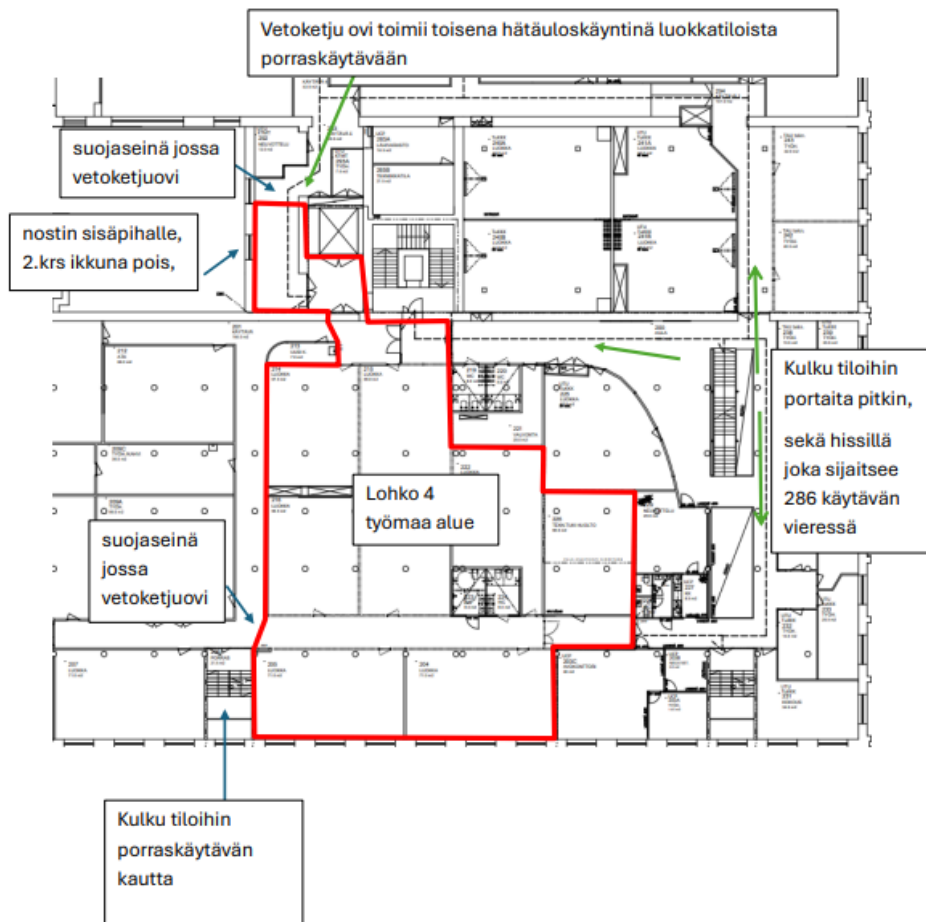

VK 34 Tavoitteet – Objective

- Lohkot 1-2 valmistuminen → Completion of Blocks 1–2
- Lohko 3 väliseinätöiden jatkuminen → Partition wall works continue in Block 3
- Lohko 4 purkutöiden jatkuminen → Demolition works continue in Block 4
