


UCPORI – muutostyöt 2026



VK 34

- Lohkot 1-2 valmistuminen → Completion of Blocks 1–2
- Lohko 3 töiden jatkuminen → Continuation of works in Block 3
- Lohko 4 purkutöiden jatkuminen → Continuation of demolition works in Block 4
- Vuokralaisten kalustusten asennus → Installation of tenant furnishings
- Loppusiivoukset käynnissä 1-2 lohkoissa → Final cleaning works are in progress in Blocks 1–2
- 1-2 lohkojen luovutus → Handover of Blocks 1–2

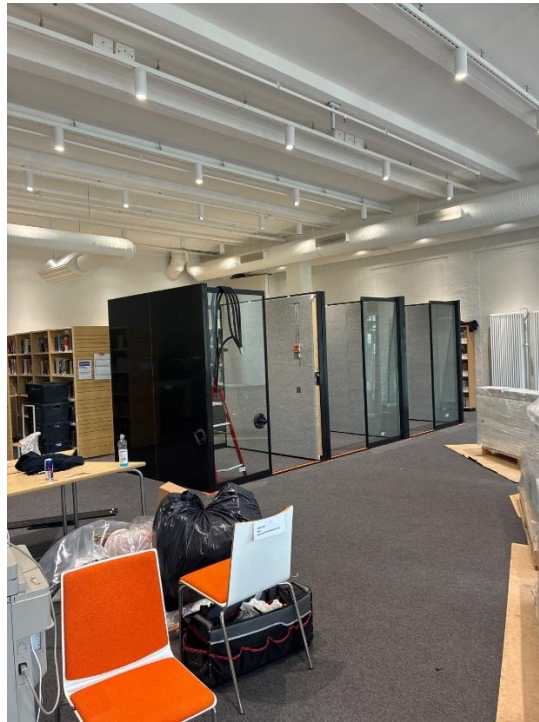

125 auditorion pöytäpistorasioiden asennustyö käynnissä → Installation of desk power outlets in Room 125 auditorium is in progress

126 monitoimitilassa kalustus käynnissä → Furnishing works in Room 126 multipurpose space are in progress



120/120A tilojen kalustaminen käynnissä → Furnishing works in Rooms 120/120A are in progress


Aulatilojen ikkunoiden pesutyöt käynnissä → Window cleaning works in the lobby areas are in progress



Väliseinätyöt käynnissä lohko 3 → Partition wall works are in progress in Block 3

Lohko 4 purkutyöt käynnissä 2.kerroksessa → Demolition works are in progress on the second floor of Block 4


Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

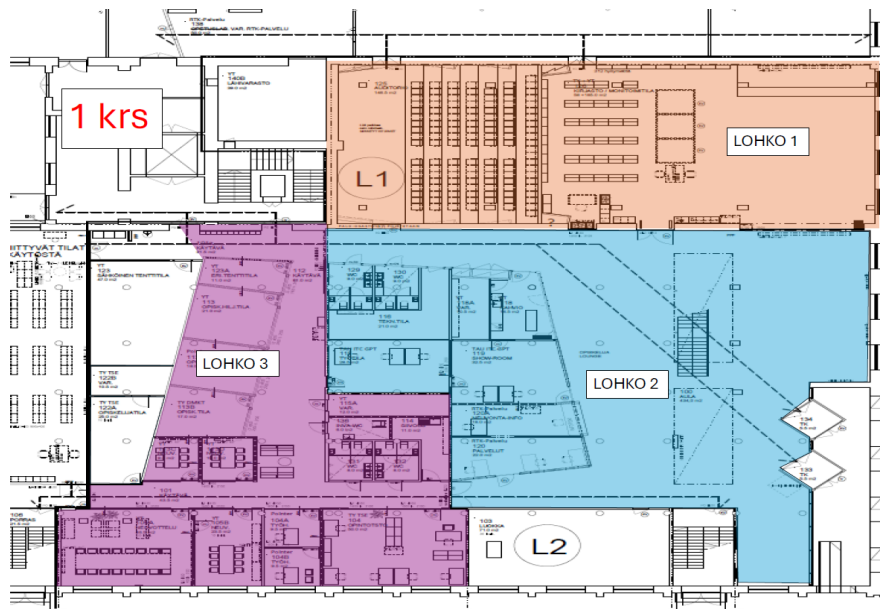

Lohkojako 2.krs → Block division second floor




lohko 4 purkukuva → block 4 demolition layout

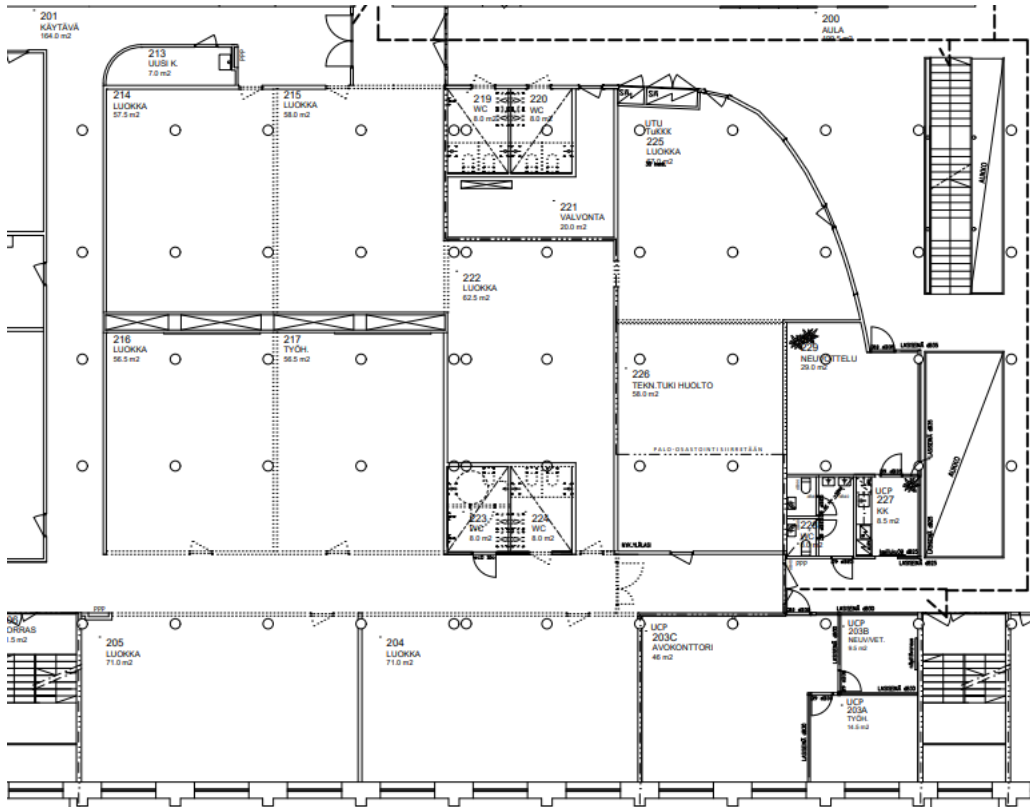

Lohko 4 työmaa-alue → Block 4 working area

lohko 4 aikataulu; 10.08-09.11

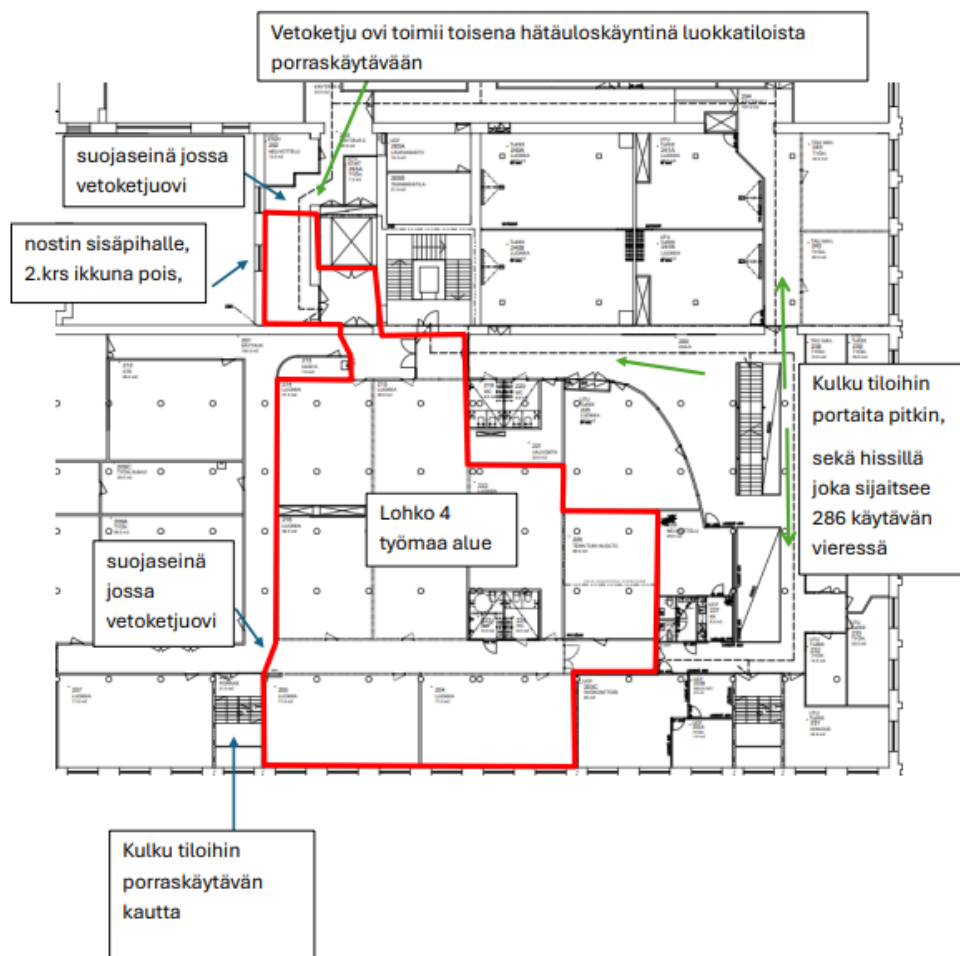

VK 35 Tavoitteet – Objective

- Lohko 3 väliseinätöiden jatkuminen → Continuation of partition wall works in Block 3
- Sähköurakoitsijan siirtyminen pääpainoitteisesti lohkoihin 3-4 → Electrical contractor shifting primary focus to Blocks 3–4
- Lohko 4 purkutöiden jatkuminen → Continuation of demolition works in Block 4
