

UCPORI – muutostyöt 2026



VK 35

- Lohko 3 väliseinätyöt, yleiskaapelointi sekä maalaus/tasoite työt jatkuvat → Partition wall works, general cabling and painting/plastering works continue in Block 3
- Lohko 3, 131/132 wc tilojen laatoitustyö käynnissä → Tiling works are ongoing in the 131/132 WC facilities in Block 3
- Lohko 4 purkutyöt käynnissä → Demolition works are ongoing in Block 4



Sisäpihan aidatut alueet →
Fenced-off areas in the courtyard






112 Käytävän levytykset tehty ja nauhoitus/maalaustyöt käynnissä → Room 112 corridor
boarding completed, taping and painting works ongoing



101 käytävän suojauksia muokattu jotta kulku vanhaan kirjastotilaan onnistuu → Protective coverings in the corridor of Room 101 have been modified to allow access to the former library area

Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

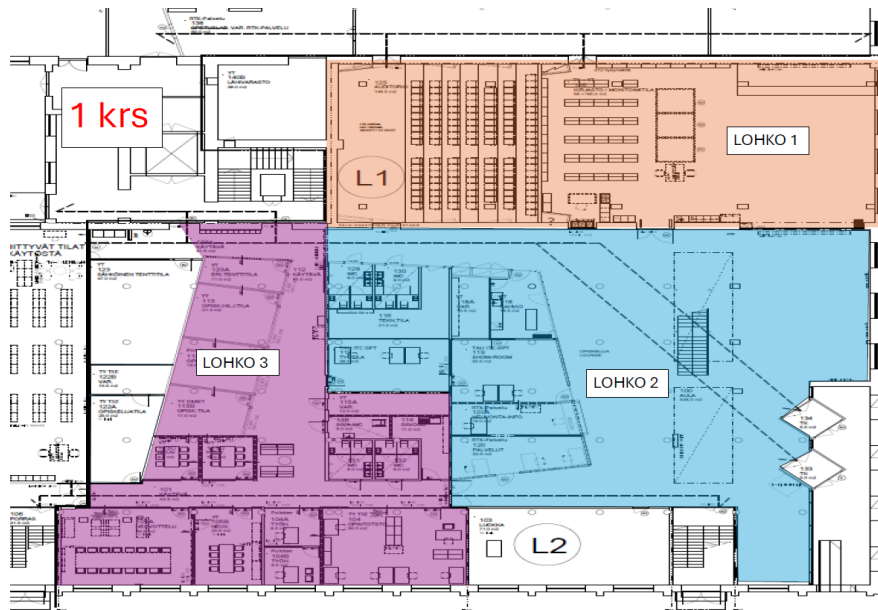


Lohkojako 2.krs → Block division second floor






lohko 4 purkukuva → block 4 demolition layout

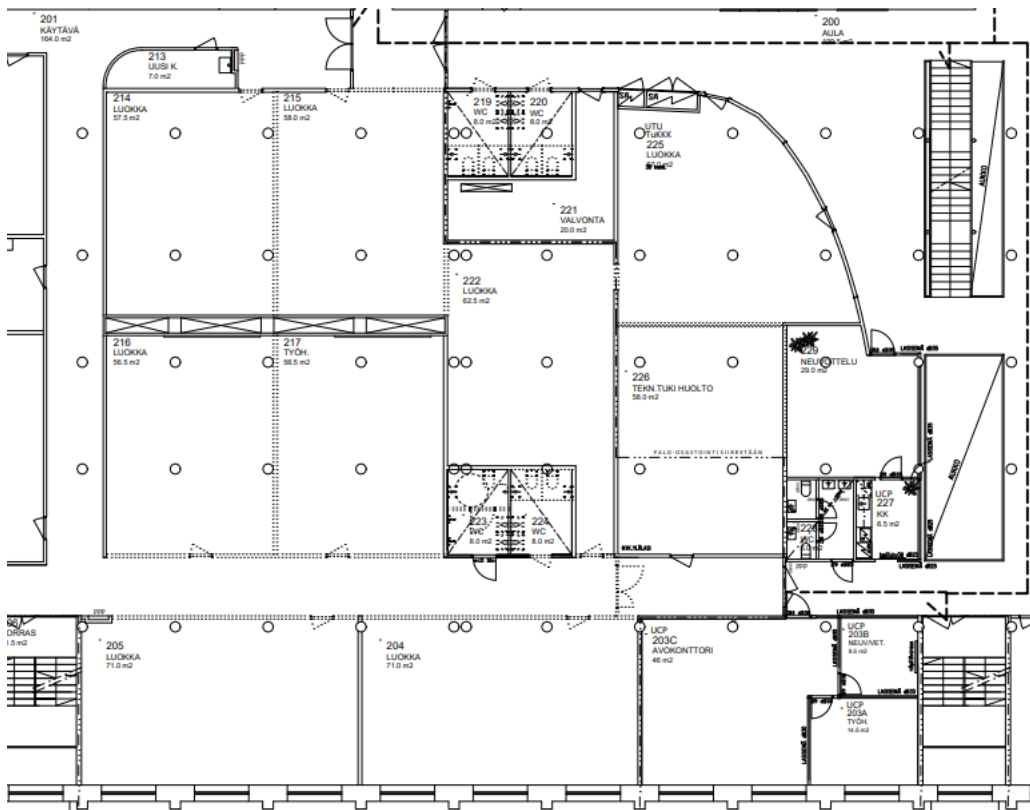

Lohko 4 työmaa-alue → Block 4 working area

lohko 4 aikataulu; 10.08-09.11

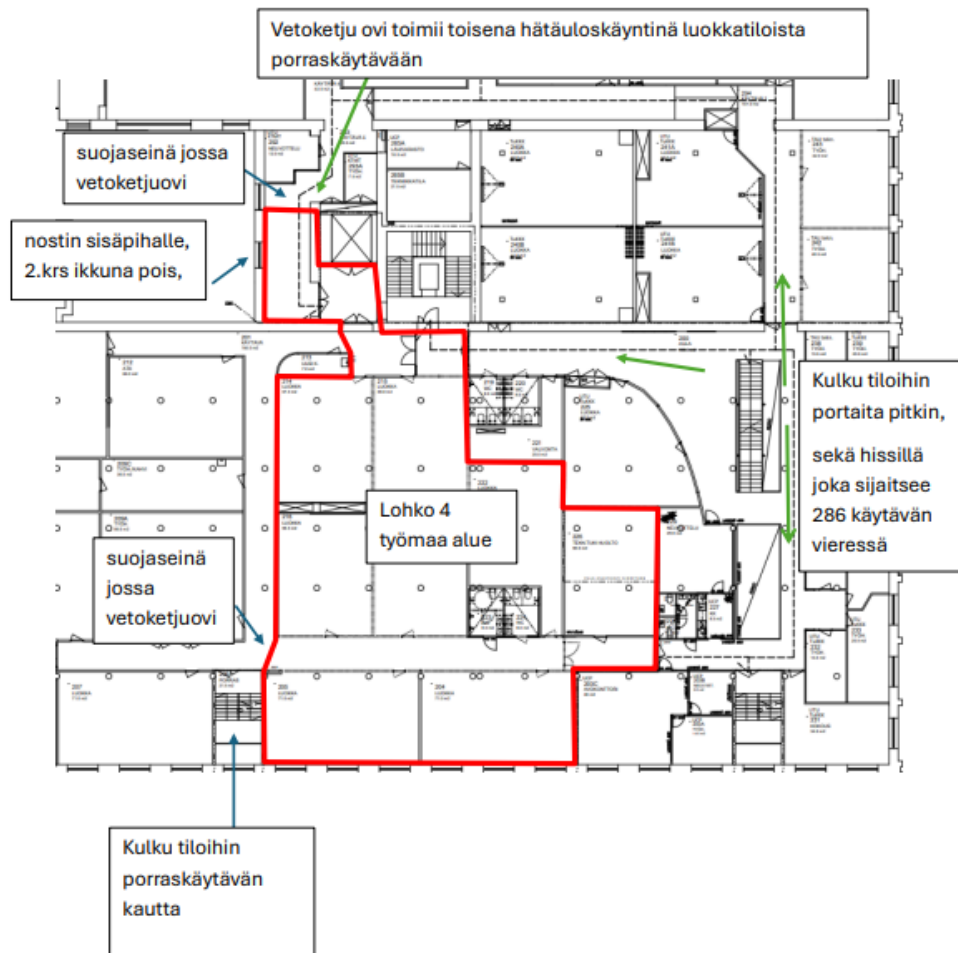

VK 36 Tavoitteet – Objective

- Lohko 3 väliseinätöiden valmistuminen → Completion of partition wall works in Block 3
- Lohko 3 maalaustöiden jatkuminen → Continuation of painting works in Block 3
- Lohko 3 valaistuksien/yleiskaapelointi työt → Lighting installation and general cabling works in Block 3
- Lohko 4 purkutöiden jatkuminen → Continuation of demolition works in Block 4
- Lohko 4 valaistuksien/yleiskaapelointi työt → Lighting installation and general cabling works in Block 4
