

UCPORI – muutostyöt 2026



VK 37

- Lohko 3 → [Block 3](#)
 - Väliseinätöiden valmistuminen → [Completion of partition wall works](#)
 - Maalaus/tasoitustyöt, 55 % valmiusaste → [Painting and levelling works, 55% completed](#)
 - Sähkötyöt käynnissä → [Electrical installation works in progress](#)
 - 131/132 wc tilojen laatoituksen valmistuminen → [Completion of tiling works in WC rooms 131/132](#)
- Lohko 4 → [Block 4](#)
 - Purkutöiden valmiusaste 80 % → [Demolition works 80% completed](#)
 - Sähkötyöt käynnissä → [Electrical installation works in progress](#)


-
- Väliseinätyöt käynnissä → [Partition wall works in progress](#)
 - Lohko 5 → [Block 5](#)
 - Purkutyöt käynnissä 225 tilassa → [Demolition works in progress in room 225](#)



112 käytävä, 123A, 113, 113 A – D tilat seinien ja katon maalaus suoritettu. Käytävän valaisinripustuskiskot asennettu → [Painting of the walls and ceilings in corridor 112 and rooms 123A, 113 and 113A–D has been completed. The lighting suspension rails in the corridor have been installed.](#)




104, 104 A – B levytys työt tehty, nauhoitustyö käynnissä → Boarding works in rooms 104 and 104A–B have been completed. Joint taping is in progress.

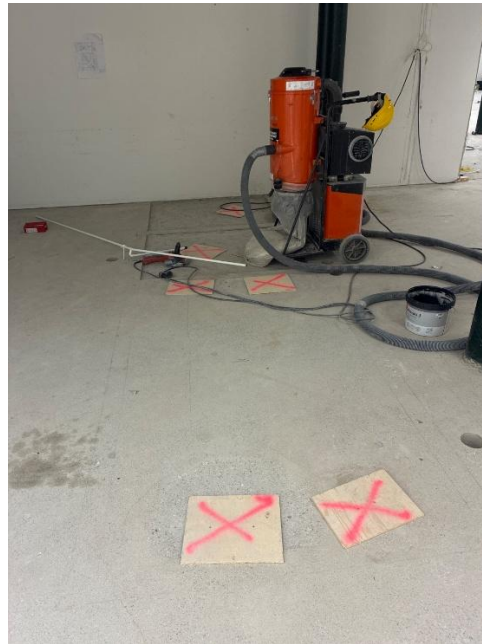

Lohko 4 rakenteelliset purkutyöt tehty. 222A – 222 D tilojen kaivot porattu sekä lattiakaadot valmisteltu → [Structural demolition works in Block 4 have been completed. Floor drains in rooms 222A–222D have been drilled, and the floors have been prepared for falls.](#)


Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

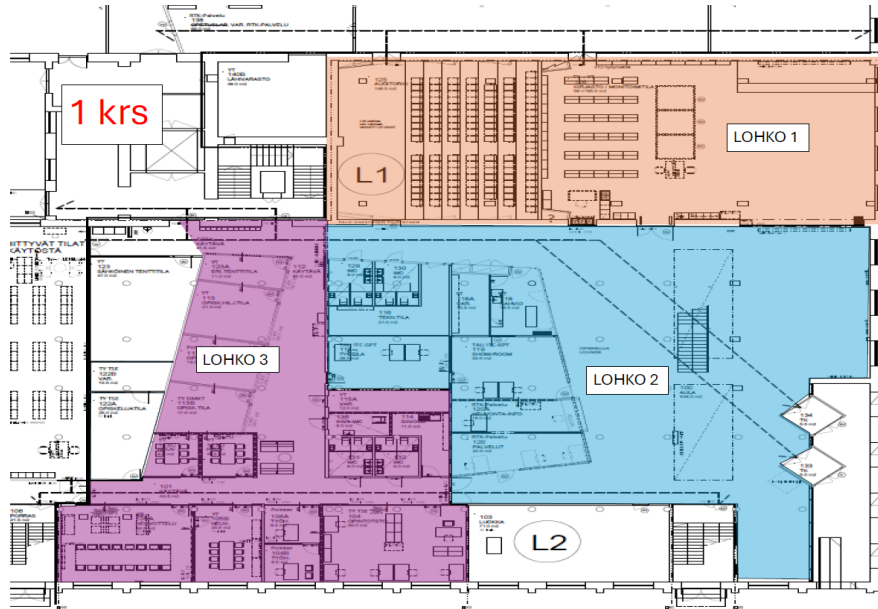

Lohkojako 2.krs → Block division second floor




lohko 4 purkukuva → block 4 demolition layout

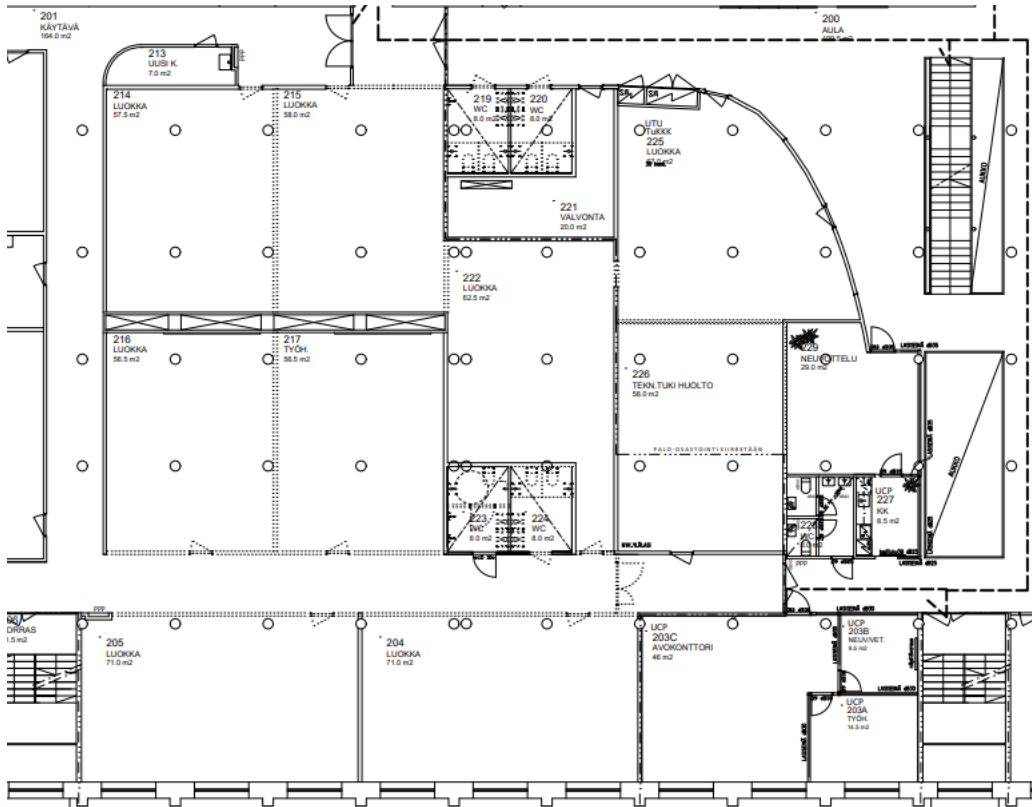



Lohko 4 työmaa-alue → Block 4 working area

lohko 4 aikataulu; 10.08-09.11

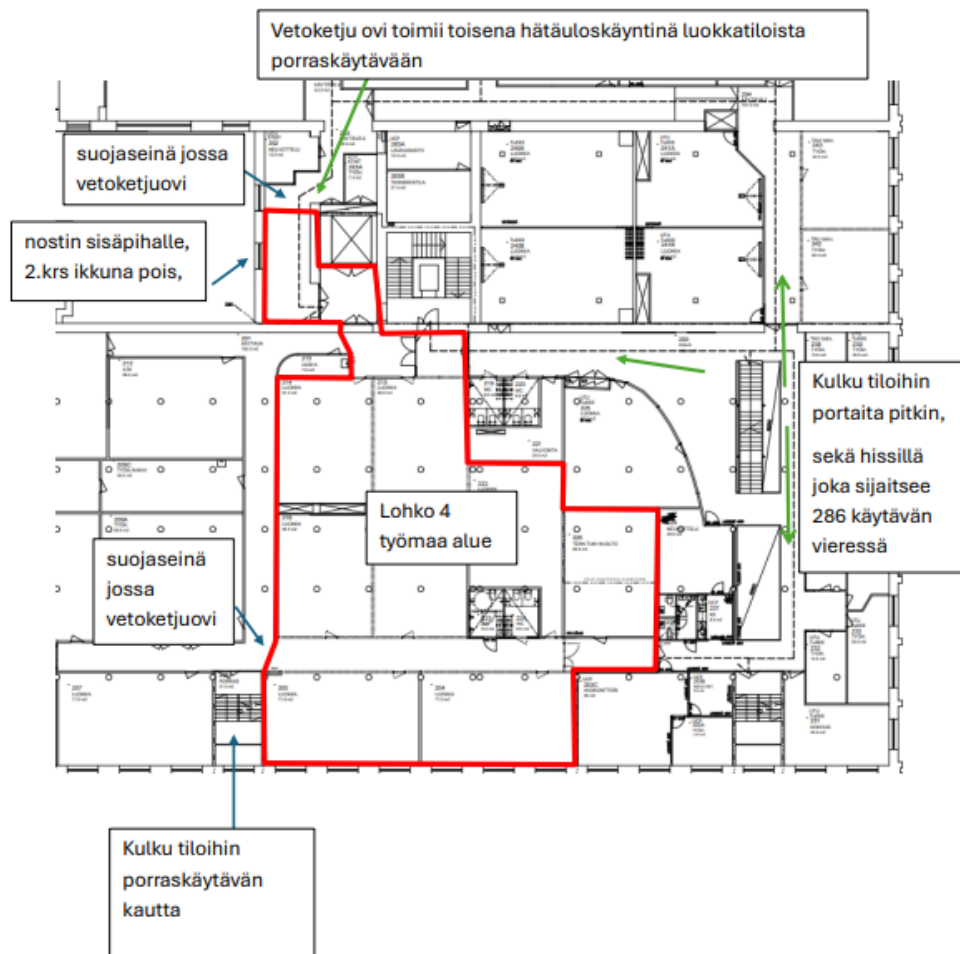

VK 38 Tavoitteet – Objective

- Lohko 3 töiden jatkuminen → [Works in Block 3 continue](#)
- Lohko 4 töiden jatkuminen → [Works in Block 4 continue](#)
- Lohko 4 purkutöiden 100 % valmistuminen → [Demolition works in Block 4 100% completed](#)
- Lohko 5.1 purkutöiden jatkuminen, siirtyminen 5.2 ja 5.3 lohkoihin → [Demolition works in Block 5.1 continue, followed by transition to Blocks 5.2 and 5.3](#)
