

Liitteessä Porin yliopistokeskuksen tilauudistustiedote vko 38/2026.

Löydät kaikki viikkoviestit Porin yliopistokeskuksen sivuilta ucpori.fi/tilauudistus.

HUOM! Sivulla 8 mainittu kulku Pohjoisranta 11C ulko-ovesta tarkoittaa yliopistokeskuksen osalta kulkua ainoastaan kolmanteen kerrokseen sekä ensimmäisen kerroksen luokkatiloihin eli ns. ”väistöluokkiin” 107, 108 ja entinen kirjasto 109.

MUUTA YLEISTÄ/AJANKOHTAISTA TILAUUDISTUKSESTA:

- Lohkon 6 työmaa alkaa **pe 2.10.2026** suojaus- ja valmistelutöillä. Tätä ennen tehdään tiloissa muuttoja ja kalustesiirtoja väistötiloihin.
- Lohkon 5 ja 6 sähkötyöt toteutuvat ti 15.9.26 UCPori henkilöstölle lähetetyn aikataulun mukaisesti. Ko. aikataulu vielä varmuuden vuoksi uudelleen liitteessä.
- Aulan ja monitoimitilan uusien kalusteiden saapuminen on hieman viivästynyt tavarantoimittajan toimitusvaikeuksien vuoksi.
- Aulassa ja monitoimitilassa tehdään AV-laitteiden asennuksia ensi viikolla (39). Asennustyöt saattavat aiheuttaa ajoittaista häiriötä mutta tilat ovat ko. töiden aikanakin käytettävissä. Muistetaan kuitenkin noudattaa varovaisuutta esim. valkokankaan asennuksen aikaisessa kulkemisessa.
- Lokakuun alussa Exam-luokka siirtyy takaisin vanhalle paikalleen 1. kerroksen tilaan 123. Lisätietoja myöhemmin.
- Aiemmin ilmoittamamme viikoilla 42-43 (12.10.-25.10.2026) suoritettavat opetustilojen sähköasennukset ja valaistusmuutokset koskevat tiloja LK 103 August sekä luokkia 266, 267 ja 240A+B.

-Mainiota perjantaita ja viikonloppua! 😊

Attached is the University Consortium of Pori's facility renovation update for week 38/2026.

You can find all weekly updates on the University Consortium of Pori's website: ucpori.fi/tilauudistus.

NOTE! Access via the Pohjoisranta 11C entrance (mentioned on page 8) is limited to the third floor and the first-floor classrooms—specifically the so-called "temporary classrooms" 107, 108, and the former library space 109.

OTHER GENERAL INFORMATION/UPDATES REGARDING THE RENOVATION:

- Construction work in Section 6 begins on **Friday, October 2, 2026**, with protective measures and preparatory work. Prior to this, furniture and other items will be moved to temporary premises.
- Electrical work in Sections 5 and 6 will take place on Tuesday, September 15, 2026, in accordance with the schedule previously sent to UCPori staff. For reference, that schedule is attached again here.
- The delivery of new furniture for the lobby and multi-purpose space has been delayed due to supplier issues.
- AV equipment installation will take place in the lobby and multi-purpose space next week (Week 39). While the installation work may cause occasional disruption, the spaces will remain accessible during this time. Please be careful when moving through the area, particularly during the installation of the projection screen.
- In early October, the Exam room will move back to its original location in room 123 on the first floor. Further details to follow.
- The electrical installations and lighting modifications in teaching spaces, previously announced for weeks 42–43 (12 Oct – 25 Oct 2026), concern the space LK 103 August and classrooms 266, 267, and 240A+B.

-Have a wonderful Friday and weekend! 😊

UCPORI – muutostyöt 2026



VK 38

- Lohko 3 maalaus-, laatoitus, tate sekä sähkötyöt käynnissä → [Block 3 painting, tiling, MEP and electrical works are ongoing](#)
- Lohko 4 väliseinätyöt käynnissä → [Block 4 partition wall works are ongoing](#)
- Lohko 5 työmaa-alue rajattu sekä purkutyöt käynnistyneet → [Block 5 construction area has been secured and demolition works have commenced](#)




Lohko 3 väliseinätyöt valmistuneet. Maalaustyöt valmistuvat vko 39 → [Block 3 partition wall works have been completed. Painting works will be completed in week 39.](#)



Lohko 3 tiloissa asennetut jäähdytyspalkit sekä valaistukset. 101 käytävän päädyn maalaus vielä kesken. → Cooling beams and lighting have been installed in Block 3. Painting at the end of corridor 101 is still ongoing.




Lohko 4 purkutöiden valmistumisaste on 95 %. Väliseinätyöt käynnissä. → [Block 4 demolition works are 95% complete. Partition wall works are ongoing.](#)

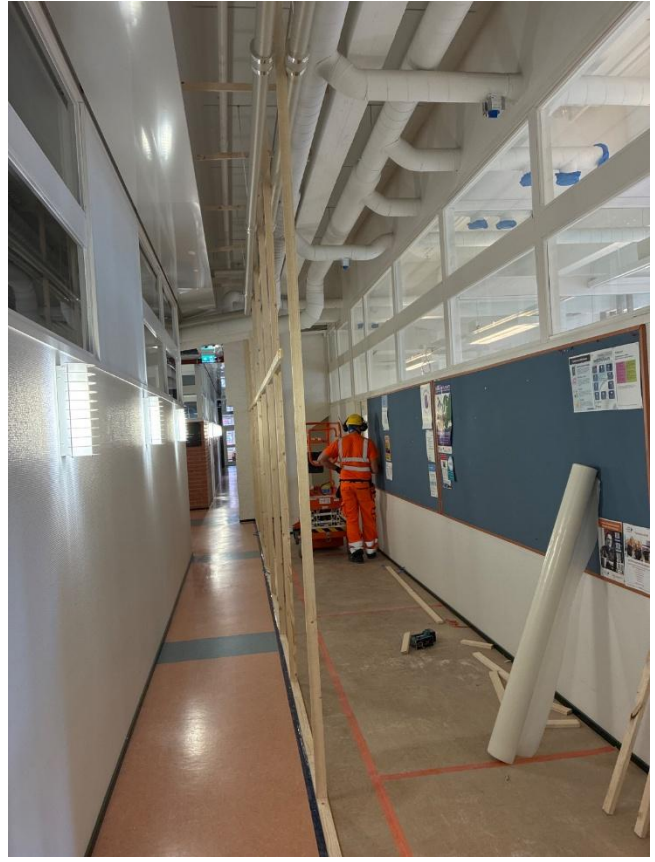

Lohko 5, 200 aulan kulkureitti rajattu puolelta käytävältä sekä 294 A käytävä → [In Block 5](#), the access route through lobby 200 has been restricted to one half of the corridor, as well as in corridor 294A.

Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

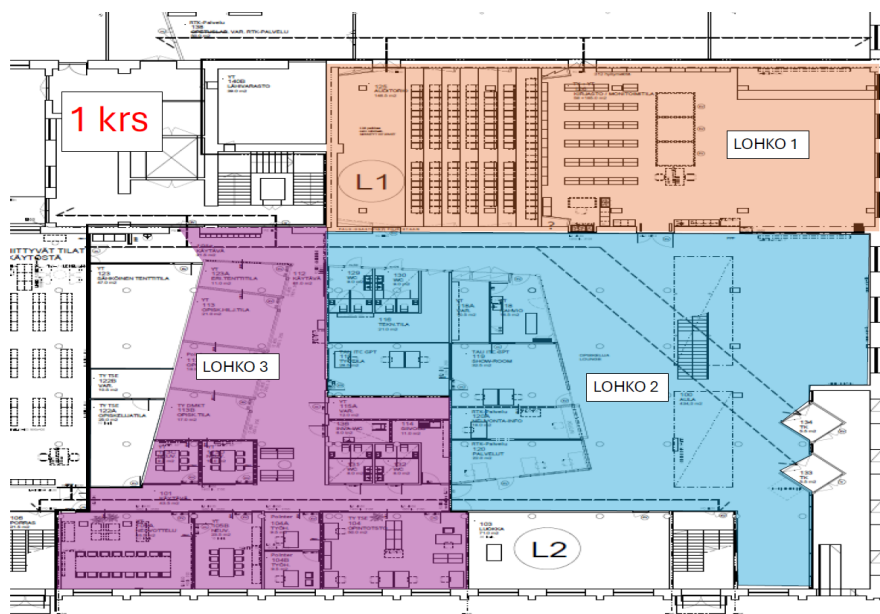


Lohkojako 2.krs → Block division second floor






lohko 4 purkukuva → block 4 demolition layout

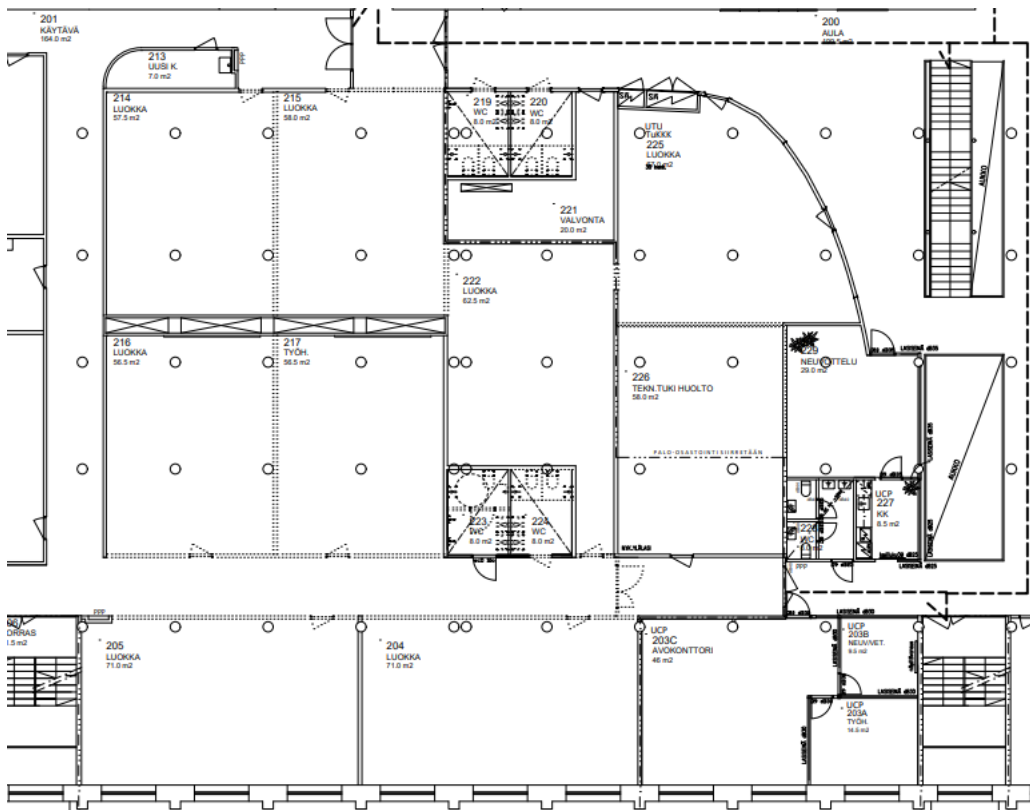

Lohko 4 työmaa-alue → Block 4 working area

lohko 4 aikataulu; 10.08-09.11

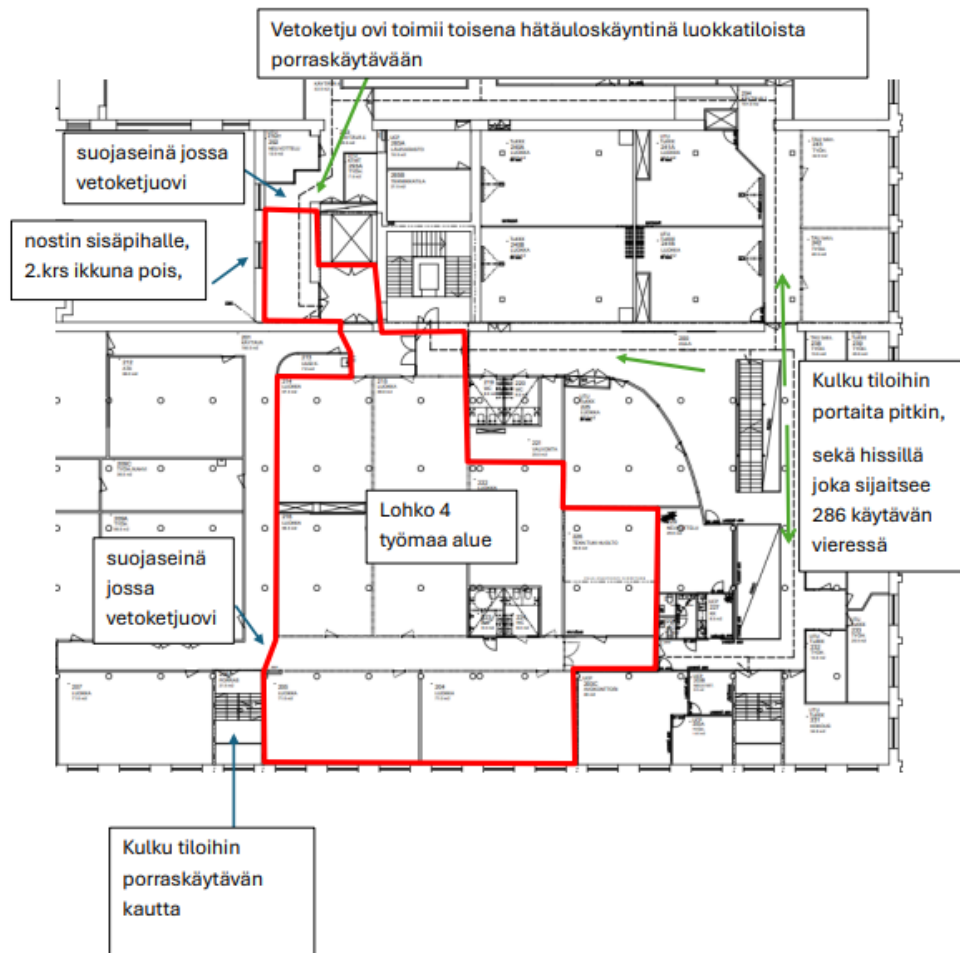

VK 39 Tavoitteet – Objective

- Lohko 3 käytävien laatoituksen aloitus → [Start of tiling works in Block 3 corridors](#)
- Lohko 4 väliseinätöiden jatkuminen → [Block 4 partition wall works continue](#)
- Lohko 5 purkutöiden jatkuminen → [Block 5 demolition works continue](#)

Lohko 5 -6 SU-erillishuoneet

