

Liitteessä Porin yliopistokeskuksen tilauudistustiedote vko 39/2026.

Löydät kaikki viikkoviestit Porin yliopistokeskuksen sivuilta ucpori.fi/tilauudistus .

HUOM! Sivulla 8 mainittu kulku Pohjoisranta 11C ulko-ovesta tarkoittaa yliopistokeskuksen osalta kulkua ainoastaan kolmanteen kerrokseen sekä ensimmäisen kerroksen luokkatiloihin eli ns. ”väistöluokkiin” 107, 108 ja entinen kirjasto 109.

MUUTA YLEISTÄ/AJANKOHTAISTA TILAUUDISTUKSESTA:


- Aulan ja monitoimitilan tekniikka ja valkokankaat on saatu pääosin asennettua
- Sähköinen tenttiluokka siirtyy pe 2.10.2026 lähtien väistötilasta 349 takaisin vanhalle paikalleen ensimmäisen kerroksen luokkaan 123.
 - o Kulkureitit tenttiluokkaan varmistuvat remontin edetessä. Seuraa nettisivuilla olevaa sähköisen tenttimisen sivua <https://ucpori.fi/fi-fi/palvelut/sahkoinen-tenttitila-exam/233/> , jonne päivitetään ajantasaiset tiedot sitä mukaa kun saamme lisätietoa aiheesta.

112 UCPORI – tilamuutos 2026



VK 39

- Lohko 3 wc tilojen pintaputkitus, valaistusten ja kaapelointien jatkuminen → [Block 3 surface-mounted pipework in WC areas, continuation of lighting installations and cabling works](#)
- Lohko 3 esivalmistelu tekstiililaatta- ja laattatyölle → [Block 3 preparation works for textile tile and tiling works](#)
- Lohko 4 väliseinätyöt jatkuvat → [Block 4 partition wall works continue](#)
- Lohko 5 purkutyöt valmistusaste 80 % → [Block 5 demolition works 80 % complete](#)

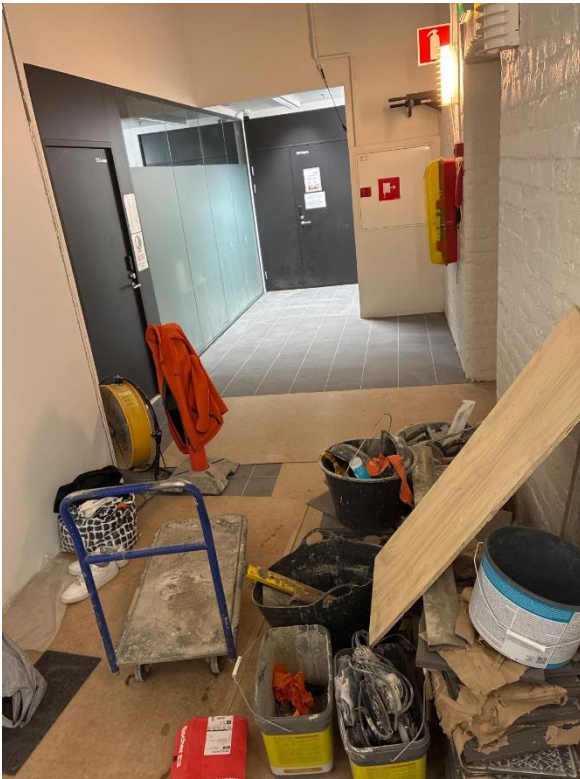

101A exam tilan edusta laatoitettu ja saumattu. Laatoitustyöt jatkuvat 112 käytävää pitkin.

→ Corridor 101A in front of Exam room 123 has been tiled and grouted. Tiling works continue along corridor 112



101 käytävän yleiskuva. 123A, 113, 113 A-D tiloissa valaistusten asennuksen käynnissä →

Overview of corridor 101. Lighting installation works are ongoing in rooms 123A, 113 and 113A–D.



Lohko 4 levytystyöt käynnissä → [Block 4 partition wall works ongoing](#)




Lohko 4 wc tilat valmiina tasoitus työhön → [Block 4 WC areas are ready for skim coating works.](#)



Lohko 5 työmaa-alue rajattu. tila 244 lattian tasoitteen poistotyö käynnissä → [Block 5 site area has been secured. Floor screed removal works are ongoing in room 244.](#)


Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

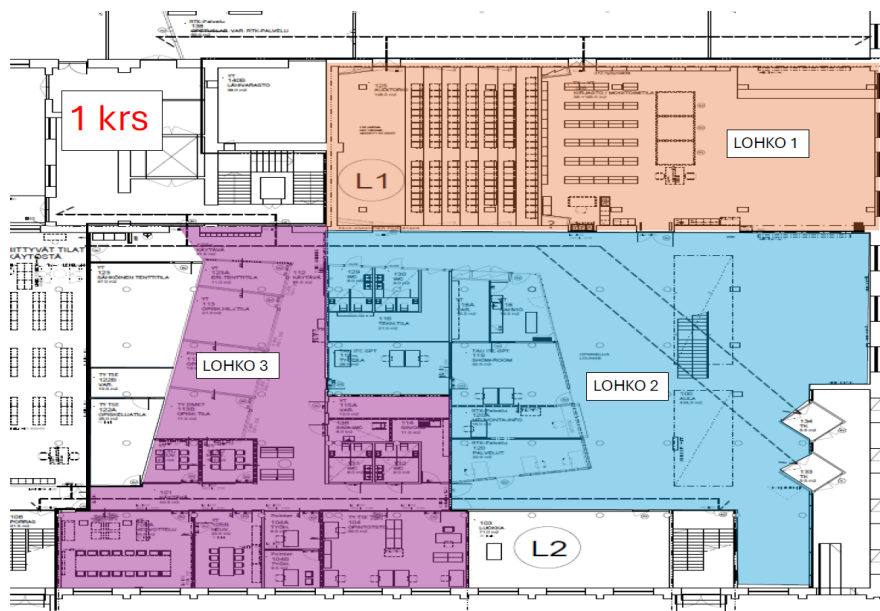

Lohkojako 2.krs → Block division second floor




lohko 4 purkukuva → block 4 demolition layout

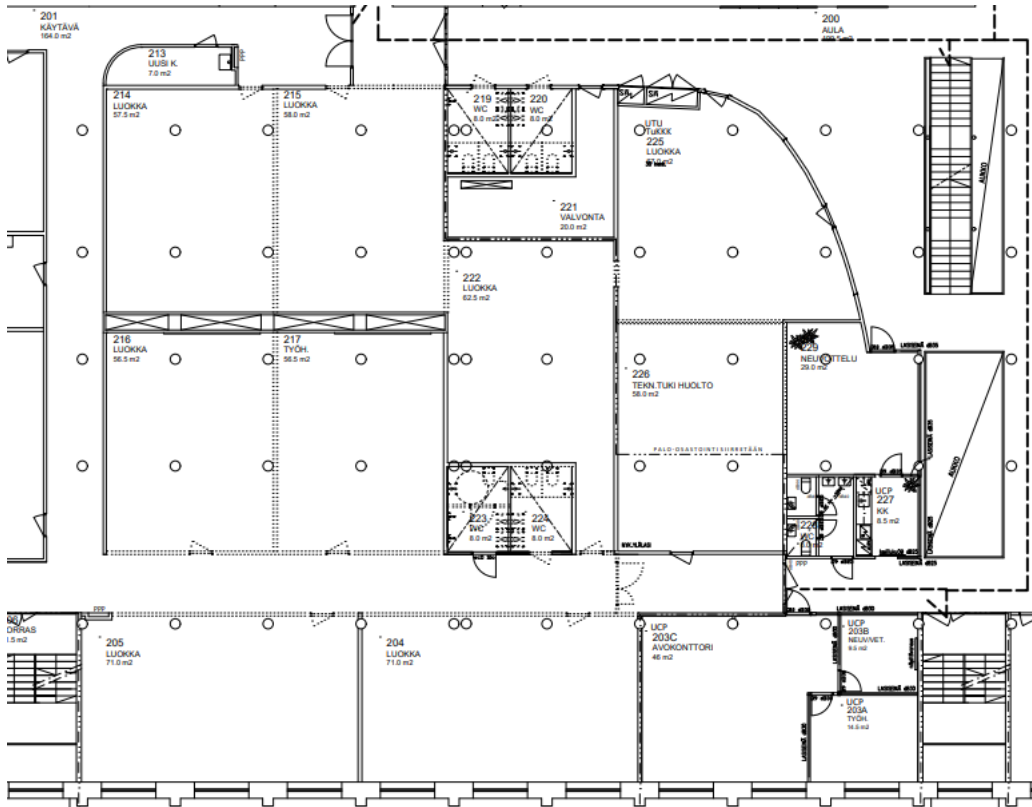

Lohko 4 työmaa-alue → Block 4 working area

lohko 4 aikataulu; 10.08-09.11

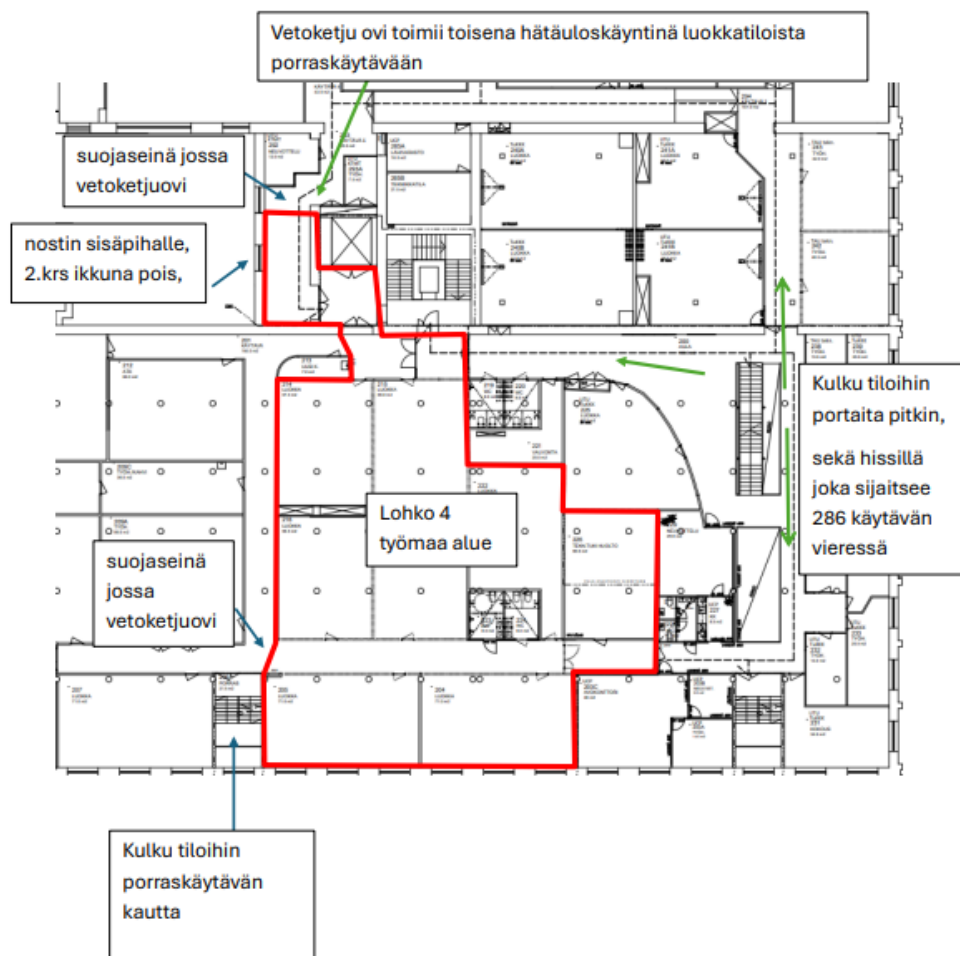

VK 40 Tavoitteet – Objective

Lohko 3 – Block 3

- käytävien laatoitus töiden jatkaminen → [Continuation of corridor tiling works](#)
- tasoite- ja tekstiililaatan asennus työt alkavat → [Skim coating and textile tile installation works to commence](#)
- Wc tilojen kalustus → [Installation of WC fixtures](#)
- valaistusten asennus → [Lighting installation works](#)
- Paikka/korjaus maalaukset → [Touch-up and repair painting works](#)

Lohko 4 – Block 4

- Väliseinätöiden jatkuminen → [Continuation of partition wall works](#)
- sähkötöiden jatkuminen → [Continuation of electrical works](#)

Lohko 5 – Block 5

- Purkutöiden valmistuminen → [Completion of demolition works](#)
