

UCPORI – muutostyöt 2026



VK 30

- Valaisinripustuskiskojen asennus ja kaapelointia → Installation of lighting suspension rails and electrical cabling
- Lohko 3 purkutyö → Demolition works in Block 3
- Väliseinien rakentamisen aloitusta lohko 3 → Start of partition wall construction in Block 3
- Lohko 2 maalausten viimeistelyä → Final painting works in Block 2



Tilat 119, 115 sekä 120 A seinien nauhoitus ja maalaus työt käynnissä. → Rooms 119, 115 and 120A: Joint taping and painting works are ongoing.



Kuva 1



Kuva 2


Tilojen 123, 122B ja 122 A vastakkaisen seinän tuplalevytys valmistunut, (kuva 1) → Double-layer plasterboard installation on the opposite wall in Rooms 123, 122B and 122A has been completed, (photo 1)

101 käytävän seinäosien purkutyö käynnissä, (kuva2) → Demolition works on the wall sections in Corridor 101 are ongoing (Photo 2)




131/132 wc tilojen pintojen purkutyö käynnissä. Tila alipaineistettu ja oviaukot muovitettu pölynhallinnan varmistamiseksi → Surface demolition works are ongoing in WC rooms 131/132. The area is under negative pressure, and the door openings have been sealed with plastic sheeting for dust control


Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

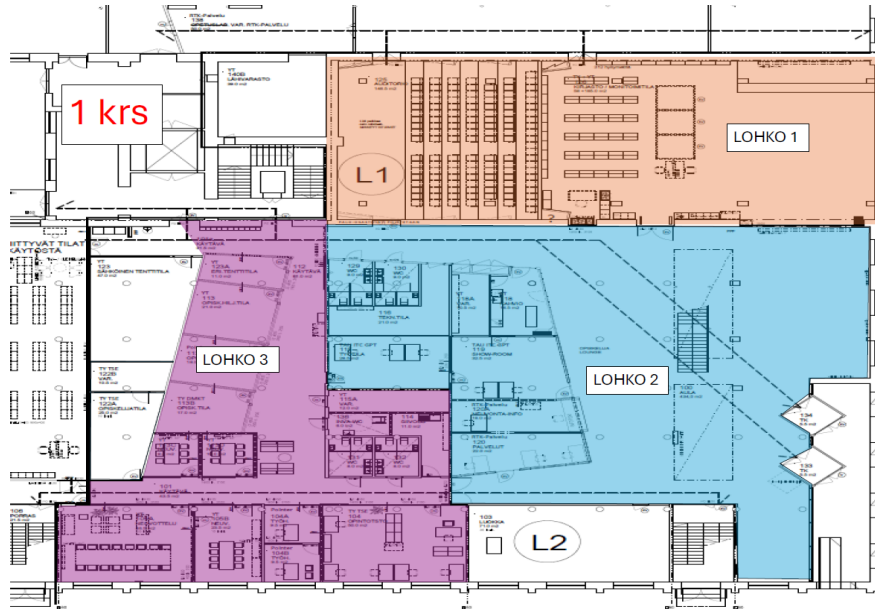

1.krs purkukuva → 1st floor demolition layout

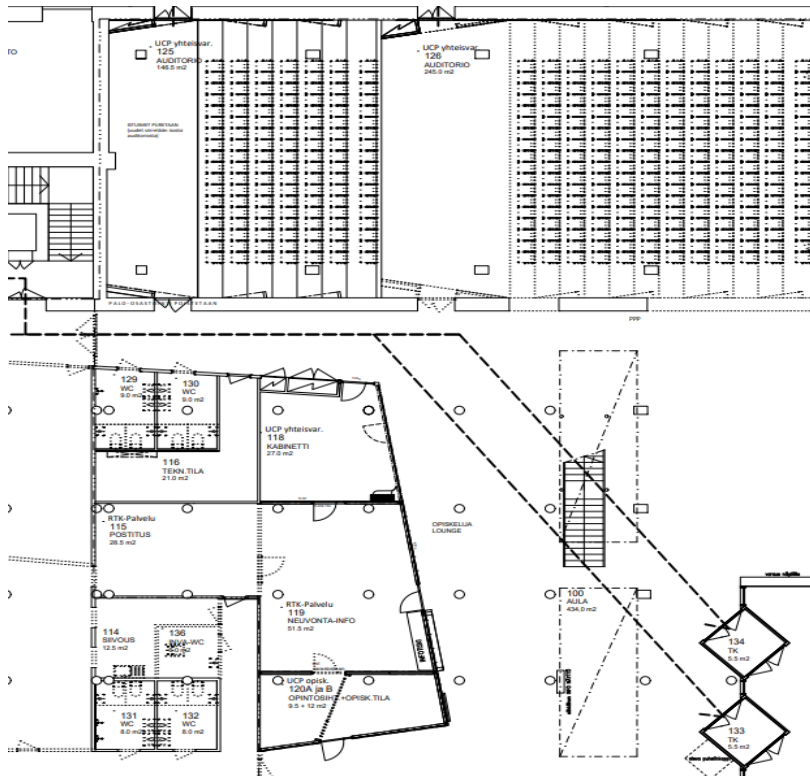

1.krs purkukuva → 1st floor demolition layout

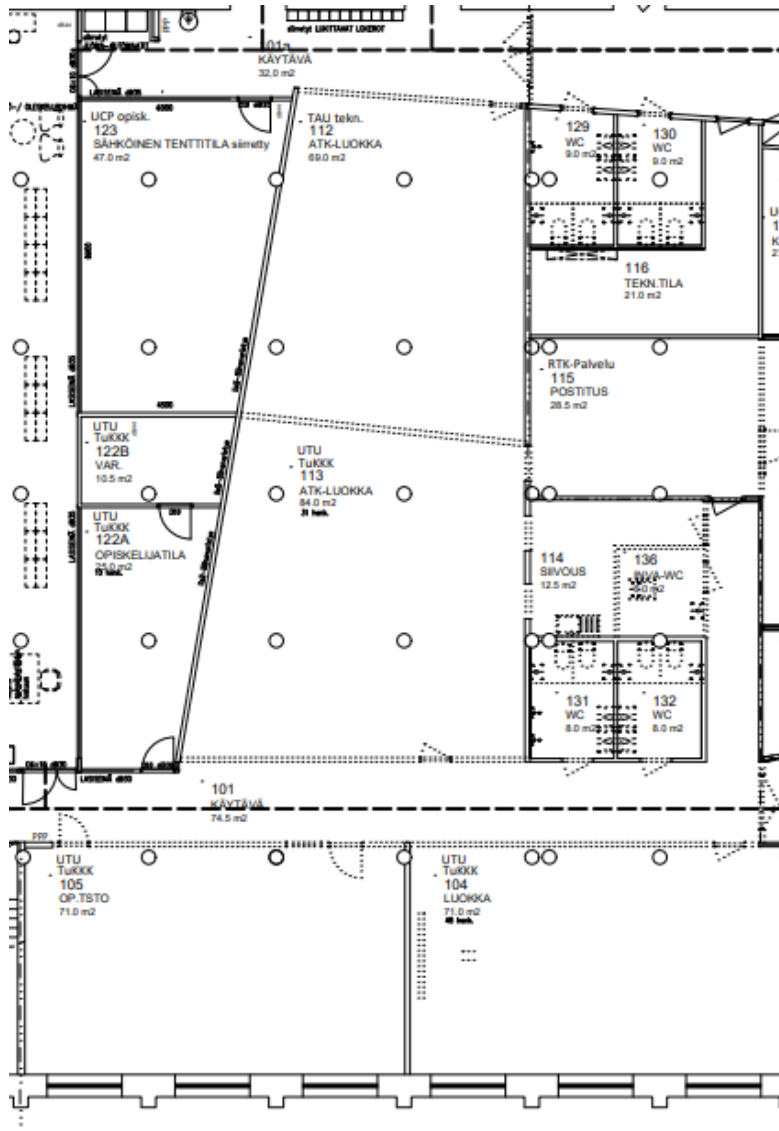

VK 31 Tavoitteet – Objective

- Lohko 3 purkutyöt → Demolition works will commence in Block 3.
- Väliseinätyöt jatkuvat → Partition wall works continue
- ripustuskiskojen asennus sekä kaapelointia → Installation of lighting suspension rails and electrical cabling
- Purkutöiden valmistuminen lohko 3 → Completion of demolition works in Block 3
- Tekstiililaatan asennus 125 auditorio sekä 126 kirjastotila → Installation of carpet tiles in Auditorium 125 and Library Room 126
