

Liitteessä Porin yliopistokeskuksen tilauudistustiedote vko 41/2026.

Löydät kaikki viikkoviestit Porin yliopistokeskuksen sivuilta ucpori.fi/tilauudistus .

HUOM! Sivulla 8 mainittu kulku Pohjoisranta 11C ulko-ovesta tarkoittaa yliopistokeskuksen osalta kulkua ainoastaan kolmanteen kerrokseen sekä ensimmäisen kerroksen luokkatiloihin eli ns. ”väistöluokkiin” 107, 108, entinen kirjasto 109 ja exam-luokka 123.

MUUTA YLEISTÄ/AJANKOHTAISTA TILAUUDISTUKSESTA:

- Näillä näkymin aulan kalusteet saapuvat lokakuun lopulla.
- Exam-tenttijät: Ajantasaiset kulkureitit exam-tilaan 123 päivitetään aina UCPorin sähköisen tenttimisen sivuille <https://ucpori.fi/fi-fi/palvelut/sahkoinen-tenttitila-exam/233/>, joten tarkista ohjeet sivuilta ennen tenttiäsi.
- Lohko 3:n valmistumisen suhteen ollaan tällä hetkellä aikataulussa.

-Leppoisa viikonloppua! 😊

Attached is the University Consortium of Pori’s facility renovation update for week 41/2026.

You can find all weekly updates on the University Consortium of Pori’s website:

ucpori.fi/tilauudistus.

NOTE! Access via the Pohjoisranta 11C entrance (mentioned on page 8) is limited to the third floor and the first-floor classrooms—specifically the so-called "temporary classrooms" 107, 108, the former library space 109 and exam-room 123.

OTHER GENERAL INFORMATION/UPDATES REGARDING THE RENOVATION:

- As it stands, the lobby furniture is scheduled to arrive in late October.
- Exam takers: Up-to-date routes to the Exam room (123) are always posted on the UCPori electronic exam webpage (<https://ucpori.fi/fi-fi/palvelut/sahkoinen-tenttitila-exam/233/>), so please check the instructions there before your exam.
- Work on Section 3 is currently on schedule.

-Have a relaxing weekend! 😊

112 UCPORTI – tilamuutos 2026



VK 41

- Lohko 3 – Block 3
 - Lattiapintojen tasoite-, laatoitus- sekä tekstiililaatta-asennukset → [Floor levelling, tiling and carpet tile installation works ongoing](#)
 - Kaapelointi sekä valaistuksien asennus → [Cabling and lighting installation works ongoing](#)
 - Lasien asennukset → [Installation of glass panes](#)
 - 123 Exam-tilan edustan vapautuminen käyttäjille → [Area in front of room 123 Exam opened for users](#)




Kuva 1. Lohko 3




Kuva 2. Lohko 3

- Lohko 4 – Block 4
 - Purkutyöt valmistuneet → [Demolition works completed](#)
 - Väliseinätöiden jatkuminen sekä kaapelointi → [Partition wall works and cabling ongoing](#)
 - Tasoite- ja nauhoitustyöt jatkuvat → [Jointing and taping works ongoing](#)
- Lohko 5 – Block 5
 - Purku-, kaapelointi- ja väliseinätöiden jatkuminen → [Demolition, cabling and partition wall works ongoing](#)
- Lohko 6 – Block 6
 - Aukeaa 2.10, työmaa-alueen rajausta → [Block 6 will be opened on 2 October, followed by the setup and segregation of the construction area](#)

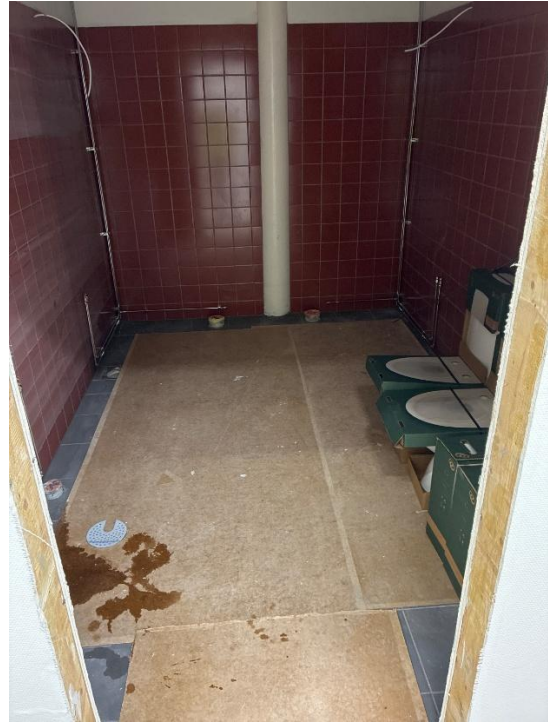

Lohko 3:n palo-ovet asennettu, sekä pintaputkitus tehty wc tiloihin. Wc tilojen kalustustyöt ovat alkaneet 5.10. → Fire doors installed and surface-mounted pipework completed in the wc areas. Restroom furnishing work began on October 5.


Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

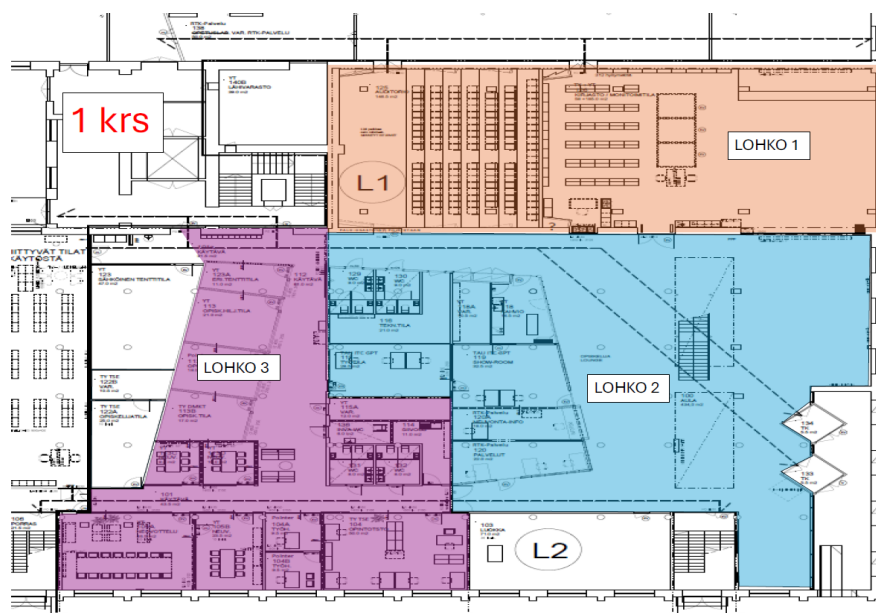

Lohkojako 2.krs → Block division second floor




Lohko 4:n purkukuva → Block 4 demolition layout

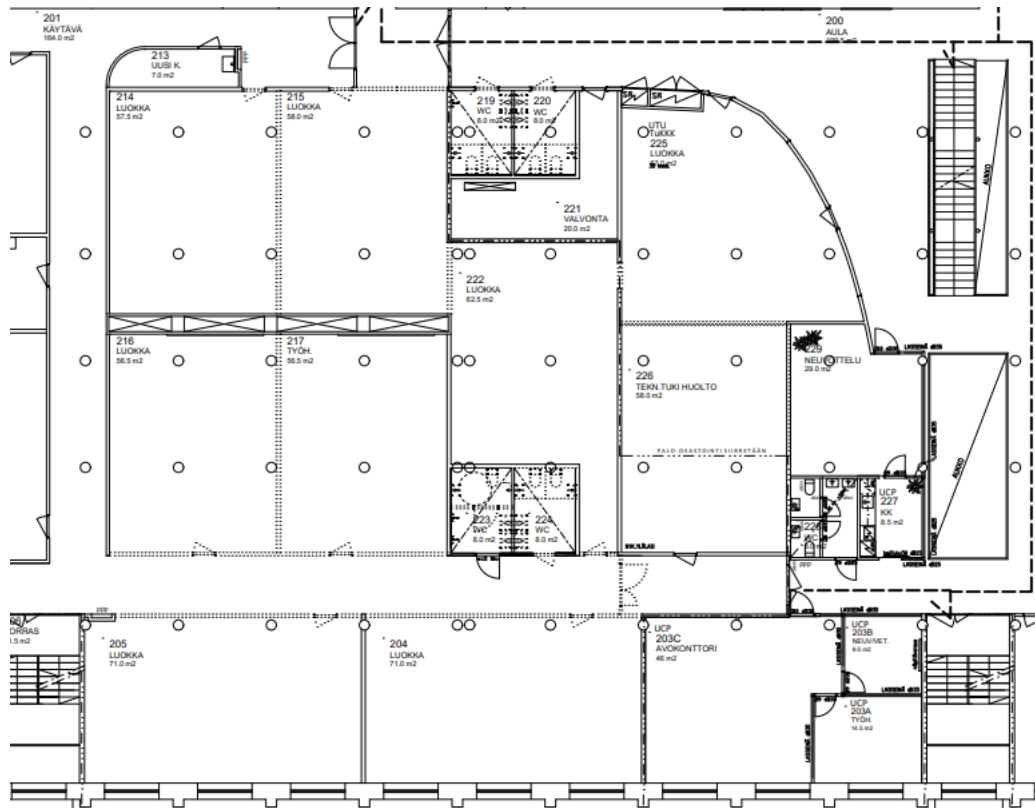



Lohko 4 työmaa-alue → Block 4 working area

lohko 4 aikataulu; 10.08-09.11

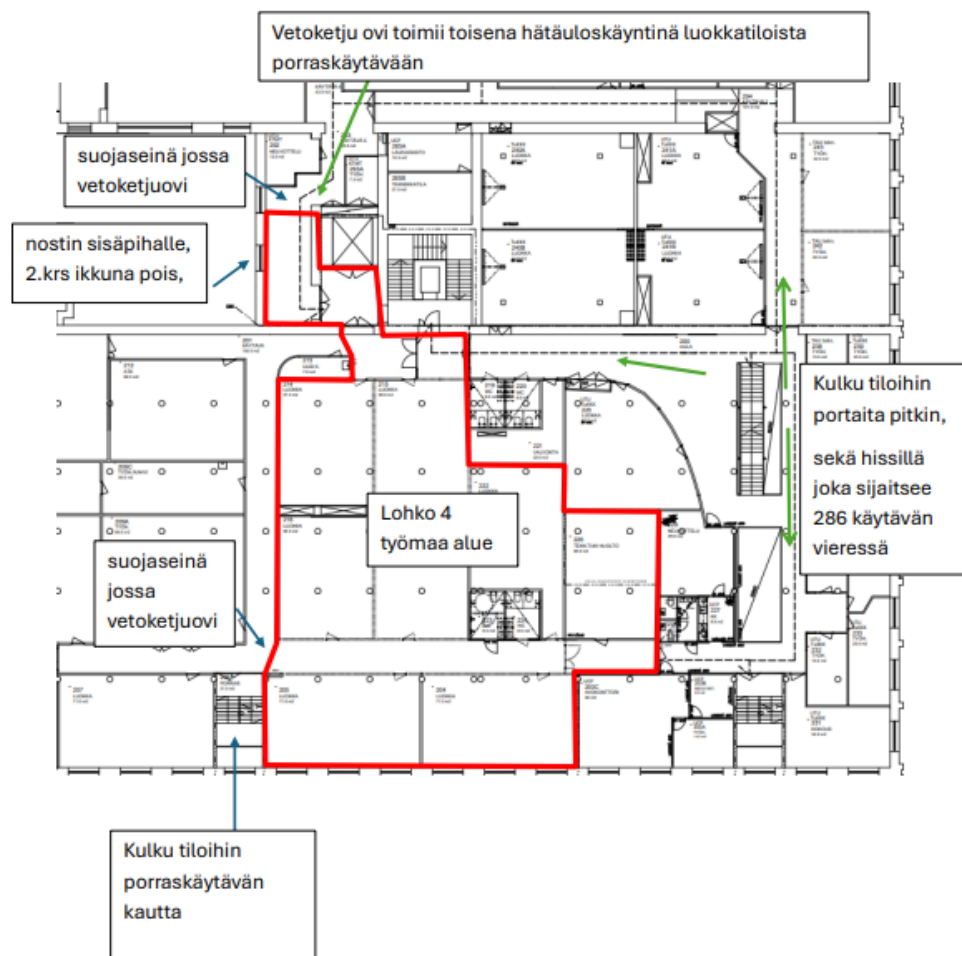

VK 42 tavoitteet – Week 42 goals

Lohko 3 – Block 3

- Käytävien laatoitus töiden jatkaminen → [Continuation of corridor tiling works](#)
- Tasoite- ja tekstiililaatan asennustyöt jatkuvat → [Levelling and carpet tile installation works ongoing](#)
- Wc-tilojen kalustustyöt alkavat → [Installation of WC fixtures will start](#)
- Valaistusten asennustyöt jatkuvat → [Lighting installation works continue](#)
- Paikka/korjaus maalaukset → [Touch-up and repair painting works](#)

Lohko 4 – Block 4

- Väliseinätöiden jatkuminen → [Continuation of partition wall works](#)
- Sähkötöiden jatkuminen → [Continuation of electrical works](#)
- Tasoite- ja nauhoitustöiden jatkuminen → [Continuation of leveling and taping works](#)

Lohko 5 – Block 5

- Purkutöiden valmistuminen → [Completion of demolition works](#)

Lohko 6 – Block 6

- Purkutöiden aloitus → [Demolition works starts](#)
