

UCPORI – muutostyöt 2026



VK 36

- Lohko 3, väliseinä-, maalaus-, kaapelointi ja laatoitustyöt jatkuvat → [Block 3: Partition wall, painting, cabling and tiling works are ongoing.](#)
- Lohko 4 purkutyöt jatkuvat → [Block 4: Demolition works are ongoing.](#)
- 1-2 lohkojen puutelistojen korjaukset → [Blocks 1–2: Defect list corrections are ongoing.](#)



123A, 113 – 113D tilojen nauhoitus/tasoite työt käynnissä. Pohjamaalauksen aloitus 4.9 →

Rooms 123A and 113–113D: Taping and plastering works are ongoing. Priming works will start on 4 September.



131/132 wc tilojen laatoitus käynnissä → [Rooms 131/132: Tiling works in the WC areas are ongoing.](#)




Lohko 4 purkutyöt; liimojen/tasoitteiden poistaminen käynnissä → [Block 4: Demolition works are ongoing; removal of adhesives and levelling compounds is in progress.](#)



Lohko 4; suihku/wc/pukuhuone kaivojen timanttiporaus suoritettu → [Block 4: Diamond drilling for the floor drains in the shower, WC and changing room areas has been completed.](#)


Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

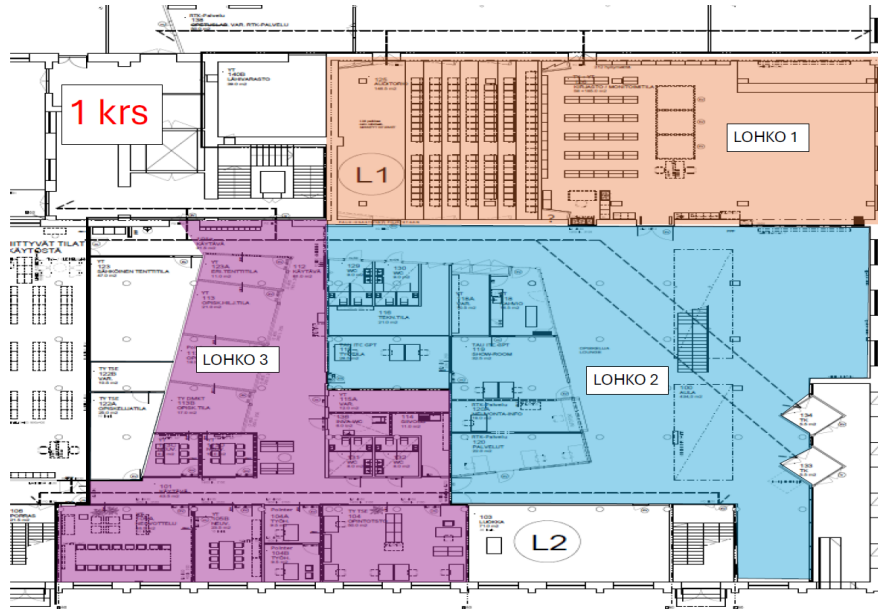

Lohkojako 2.krs → Block division second floor




lohko 4 purkukuva → block 4 demolition layout

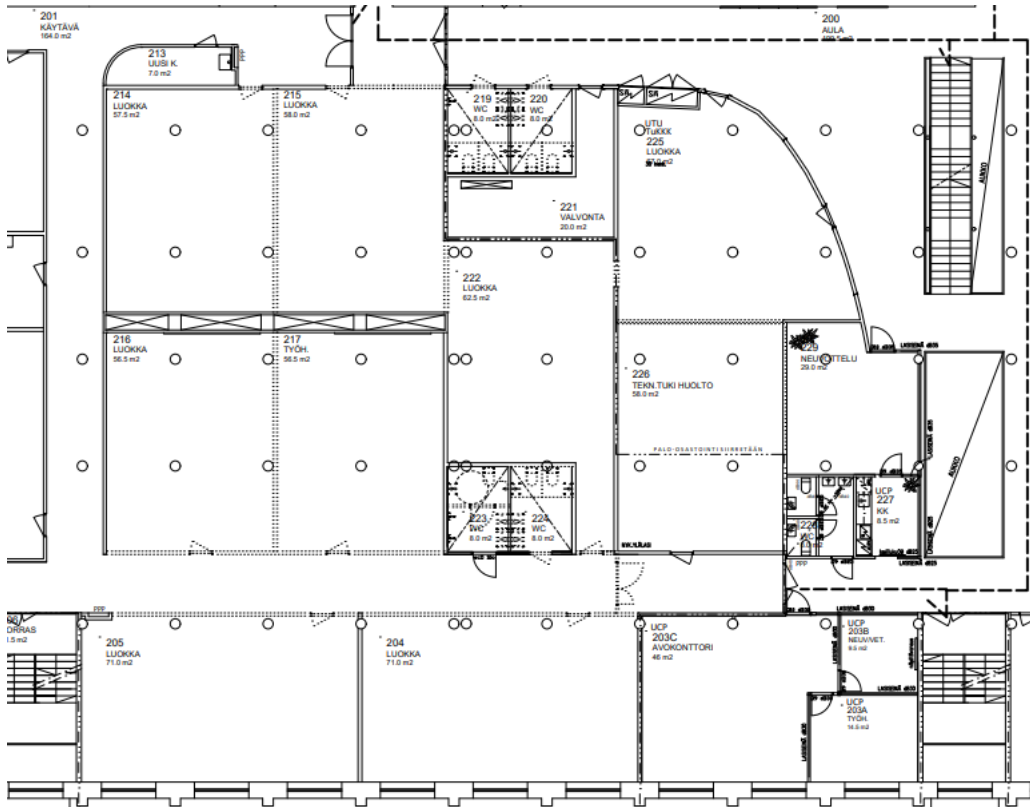



Lohko 4 työmaa-alue → Block 4 working area

lohko 4 aikataulu; 10.08-09.11

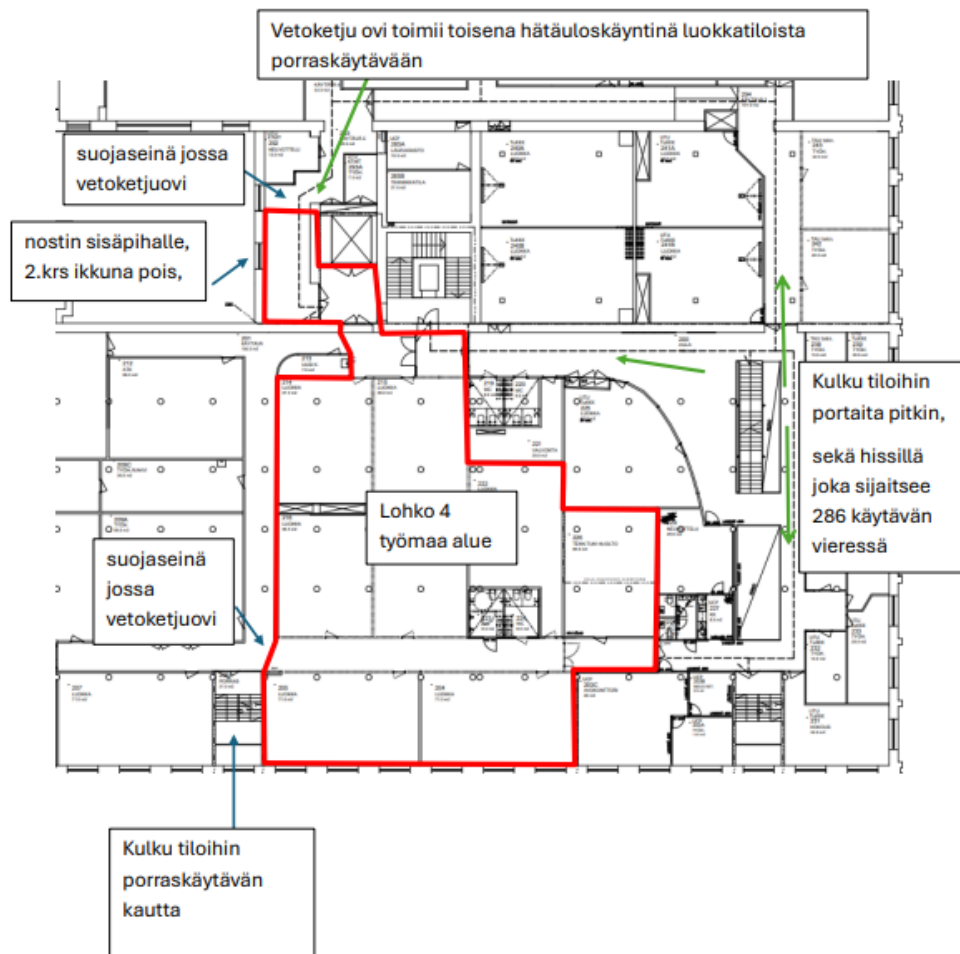

VK 37 Tavoitteet – Objective

- Lohko 3 väliseinätöiden valmistuminen → [Block 3: Completion of partition wall works.](#)
- Lohko maalaustöiden ja kaapelointien jatkuminen → [Block 3: Continuation of painting and cabling works.](#)
- 115 A, 136, 114 tilojen lattiavalujen valmistuminen → [Rooms 115A, 136 and 114: Completion of floor casting works.](#)
- wc tilat 131/132 laatoituksen valmistuminen → [WC areas 131/132: Completion of tiling works.](#)
- Lohko 4 purkutöiden jatkuminen → [Block 4: Continuation of demolition works.](#)
- Lohko 4 väliseinätöiden aloitus → [Block 4: Start of partition wall works.](#)
- Lohko 1, 126 tilan siirtolasiseinän asennus tiistai 8.9 → [Block 1, Room 126: Installation of the demountable glass partition wall on Tuesday, 8 September.](#)
- Lohko 3 käytävien laatoituksen läpikäynti ja suunnittelu Racma Oy:n kanssa → [Block 3: Review and planning of the corridor tiling works together with Racma Oy.](#)
