

UCPORI – muutostyöt 2026



VK 25


- Sähköurakoitsija aloittanut purkutyöt valaistuksista → The electrical contractor has commenced the demolition works related to the lighting installations.
- 126 tilan lattiavalun liimapinta hiottu purku urakoitsijan toimesta → The concrete floor slab in Room 126 has been mechanically ground to remove remaining adhesive residues.
- 129/130 wc tilojen pintamateriaalit purettu → The surface finishes in WC facilities 129/130 have been removed.
- 119/115 välisen seinän purkutyö käynnissä → Demolition of the wall between Rooms 119 and 115 is currently in progress.



129/130 wc tilojen pintamateriaalit purettu, siisteys työn jälkeen hyvä. → Surface finishes in WC facilities 129/130 have been removed. The area was left clean and tidy upon completion of the works.



126 tila: lattianpinta hiottu, kattovalaistus poistettu → Floor grinding works have been completed in Room 126, and the ceiling lighting installations have been removed

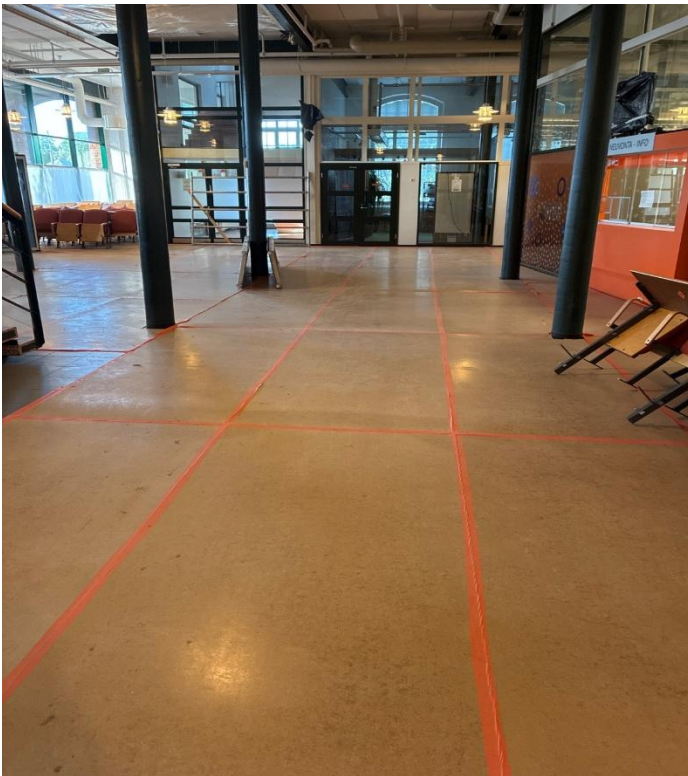


Työmaalla siisteys hyvä → The site remains clean and well organized.




Jätelavojen ympäristön siisteys ja järjestys hyvä. → The waste container area remains clean and well organized

Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

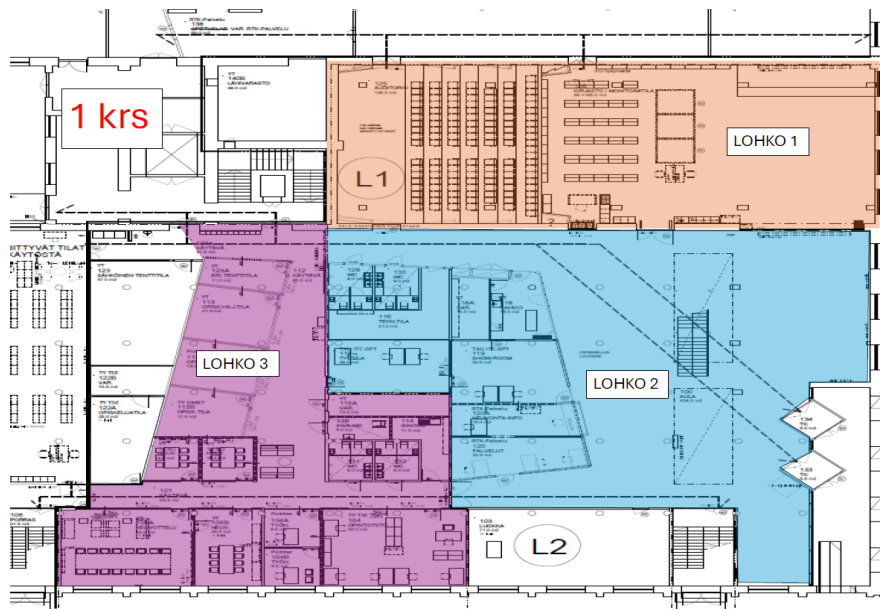

1.krs purkukuva → 1st floor demolition layout

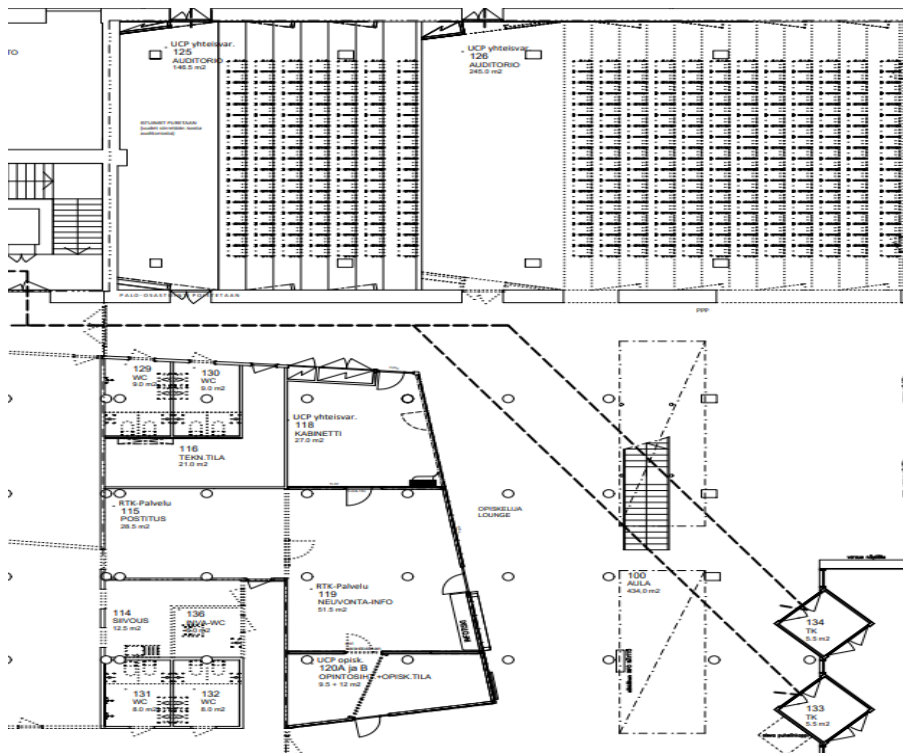

VK 26 Tavoitteet – Objective

- 126 tilan ulkoseinän sisäpinnan tiilipinnan esille otto → Exposure of the brick surface on the internal face of the external wall in Room 126.
- Valaistuksien huoltotoimenpiteet → Maintenance works on the lighting installations.
- Ilmanvaihtourakoitsija aloittaa työt → The HVAC contractor will start works.
- Lohko 2 seinäpurkua ja lattiapintamateriaalien poistoa → Wall demolition works and removal of floor finishes in Block 2.
