

UCPORI – muutostyöt 2026



VK 26

- 126 tilan ulkoseinän sisäpinnan tiilikuvion esiin ottaminen → Exposing the existing brick finish on the internal face of the external wall in Room 126
- Lohko 1 ja 2 valaistuksien purkaminen ja huoltaminen → Demolition and maintenance of the lighting systems in Blocks 1 and 2
- Tilat 115 ja 120 väliseinän purkaminen → Demolition of the partition wall between Rooms 115 and 120
- 129/130 wc tilojen sähkökaapelointi suoritettu → Electrical installation works in the wc-facilities rooms 129 and 130 have been completed



126 tilan tiilipinnan esiinottaminen → Exposure of the brickwork in Room 126




129/130 wc tilojen sähkötyöt edenneet, väliseinäurakoitsija aloittaa työt 29.6 → Electrical works in the WC facilities (Rooms 129/130) are progressing as planned. The partition wall contractor is scheduled to commence work on 29 June




tilan 115-119 välinen seinä purettu, siivoustyö käynnissä. 125 auditorion sähköjen ja valaistuksen purkutyö käynnissä. → The partition wall between Rooms 115 and 119 has been demolished. Cleaning works are in progress. Electrical and lighting demolition works in the Auditorium (Room 125) are in progress

Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

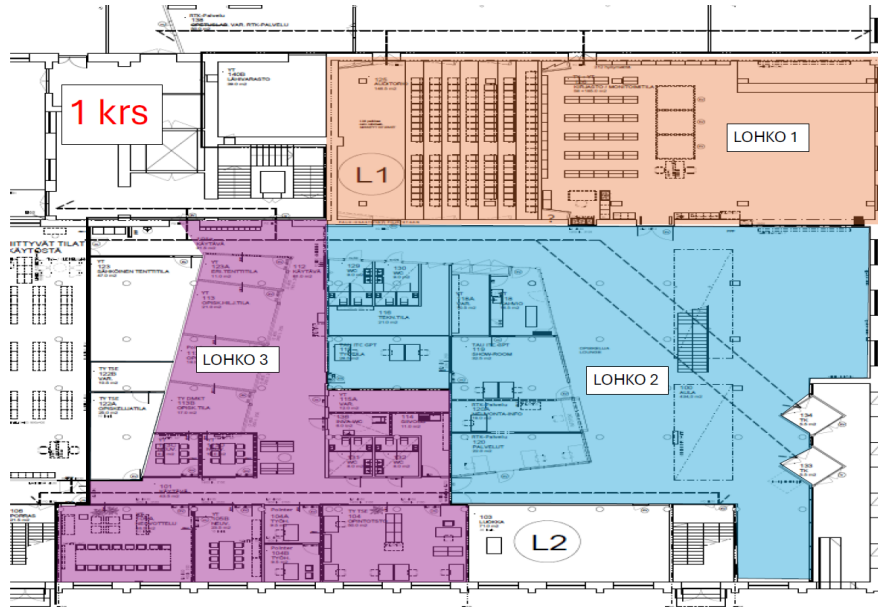

1.krs purkukuva → 1st floor demolition layout

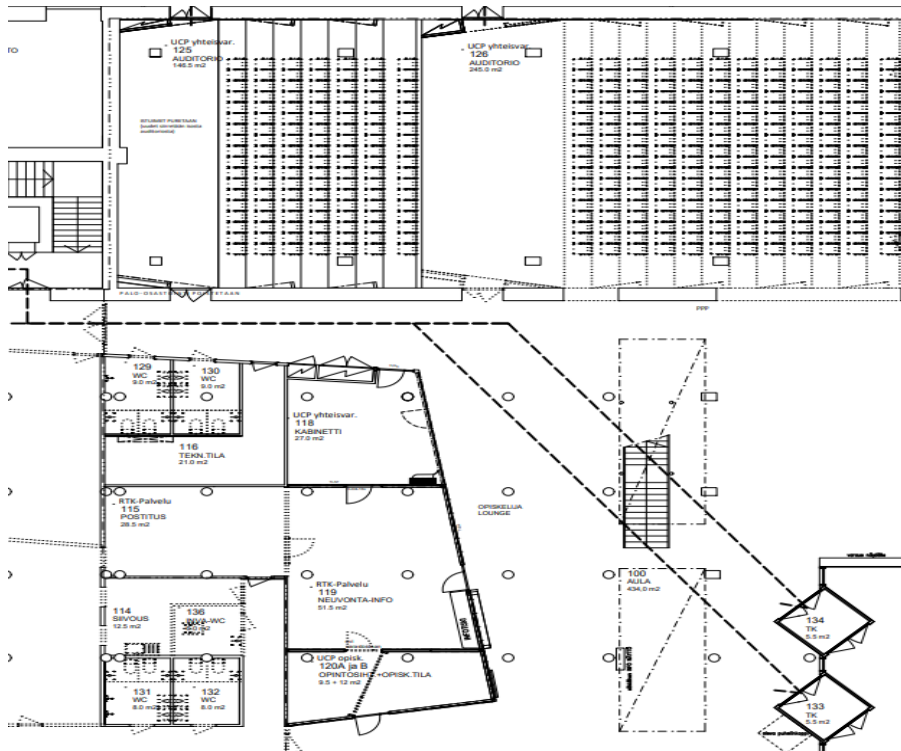

VK 27 Tavoitteet – Objective

- Väliseinäurakoitsija aloittaa työt, (Kulorak Oy) → The partition wall contractor (Kulorak Oy) will commence work
- Lohkot 1-2 lattiapintojen purku työn aloittaminen → Commencement of floor finish demolition works in Blocks 1 and 2.
- 129/130 wc tilojen levytys → Plasterboard installation in the WC facilities (Rooms 129/130).
- 126 tilan ilmanvaihtotyöt alkavat → Ventilation installation works will commence in Room 126.
