112 UCPORI – tilamuutos 2026





VK 43

- Lohko 3 – Block 3
  - Puutteiden korjaaminen → Rectification of identified deficiencies.
- Lohko 4 – Block 4
  - Maalaustyöt 60 % → Painting works 60% completed
  - Sähkötyöt käynnissä → Electrical works in progress
  - Laatoitus tiloissa käynnissä → Tiling works in progress
- Lohko 5 – Block 5
  - Purkutyöt valmistuneet → Demolition works completed
  - Seinien levytys työt jatkuvat → Wall plasterboard installation works continue

- Sähkötyöt jatkuvat → Electrical works continue

- Lohko 6 – Block 6
  - Purku työt käynnissä → Demolition works in progress
  - Seinäpaikkojen mitoitus työt käynnissä → Wall location setting-out works are ongoing.

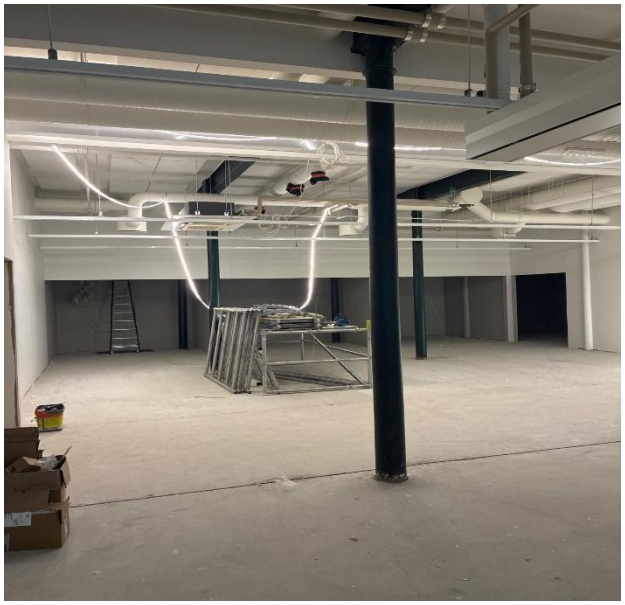


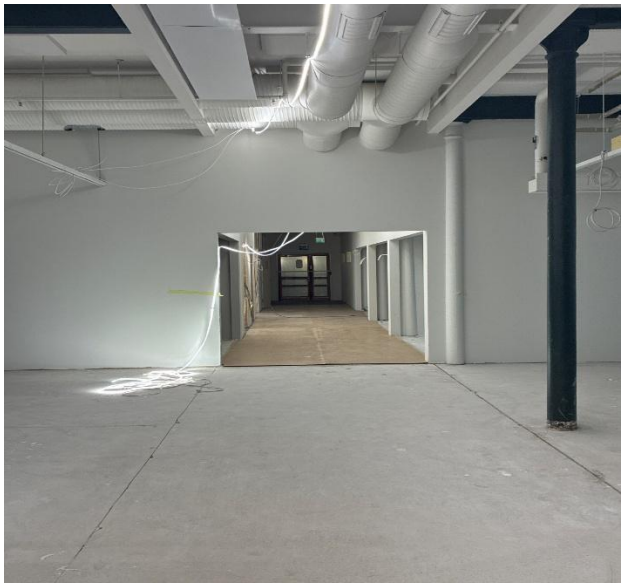

tiloissa 205, 216A-C, 217, 217A, 204A-C, 203C maalaustyöt valmistuneet, sähkötyöt jatkuvat sekä lattioiden tasoitustyöt alkavat 26.10. 200A käytävä laatoitettu. →


Painting works have been completed in rooms 205, 216A–C, 217, 217A, 204A–C and 203C. Electrical works are ongoing, and floor levelling works will begin on 26 October. Tiling in corridor 200A has been completed.



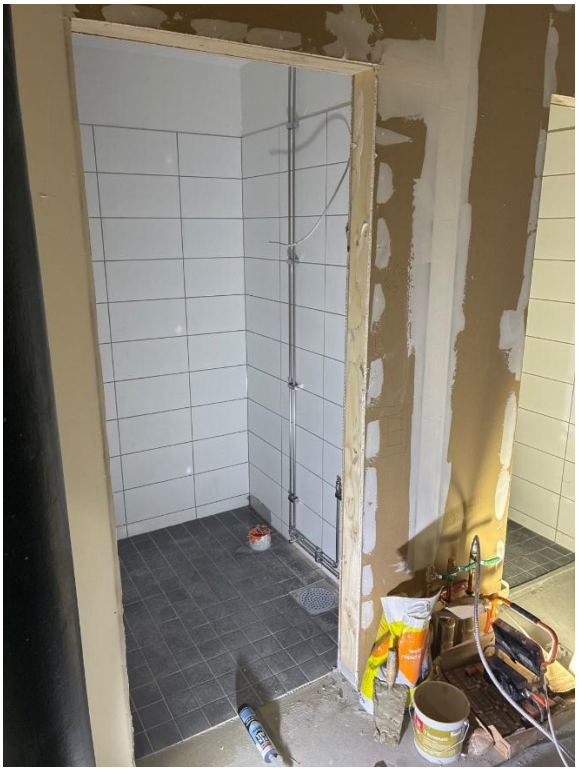

Suihku ja wc tilat 222E-222F laatoitus valmistunut, pintaputkitus työ käynnissä →

Tiling works in shower and WC rooms 222E–222F have been completed. Surface-mounted pipe installation works are ongoing.

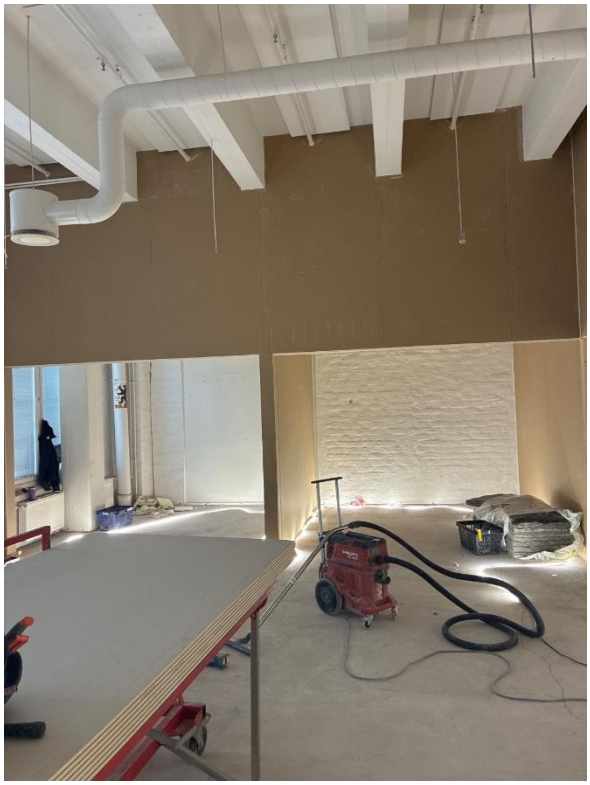





Lohko 5 levytys työt valmistuvat vko44 → Block 5 – Wall boarding works will be completed in week 44.

Lohko 6 lattioiden hionnoista suoritettu n. 75 % → Block 6 Floor grinding works are approximately 75 % complete


Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

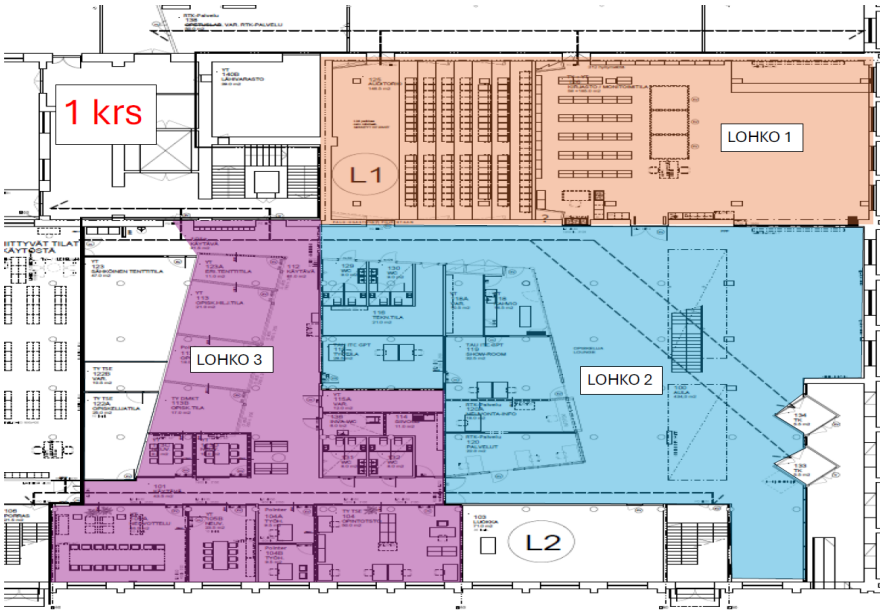


Lohkojako 2.krs → Block division second floor

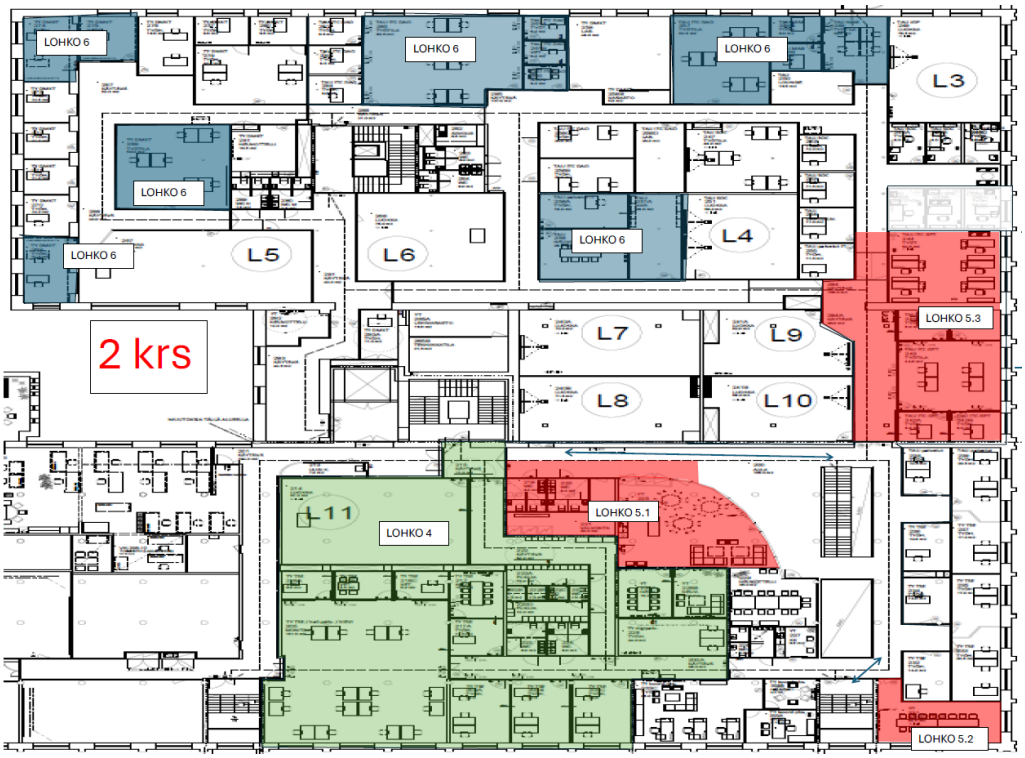

Lohko 4:n purkukuva → Block 4 demolition layout

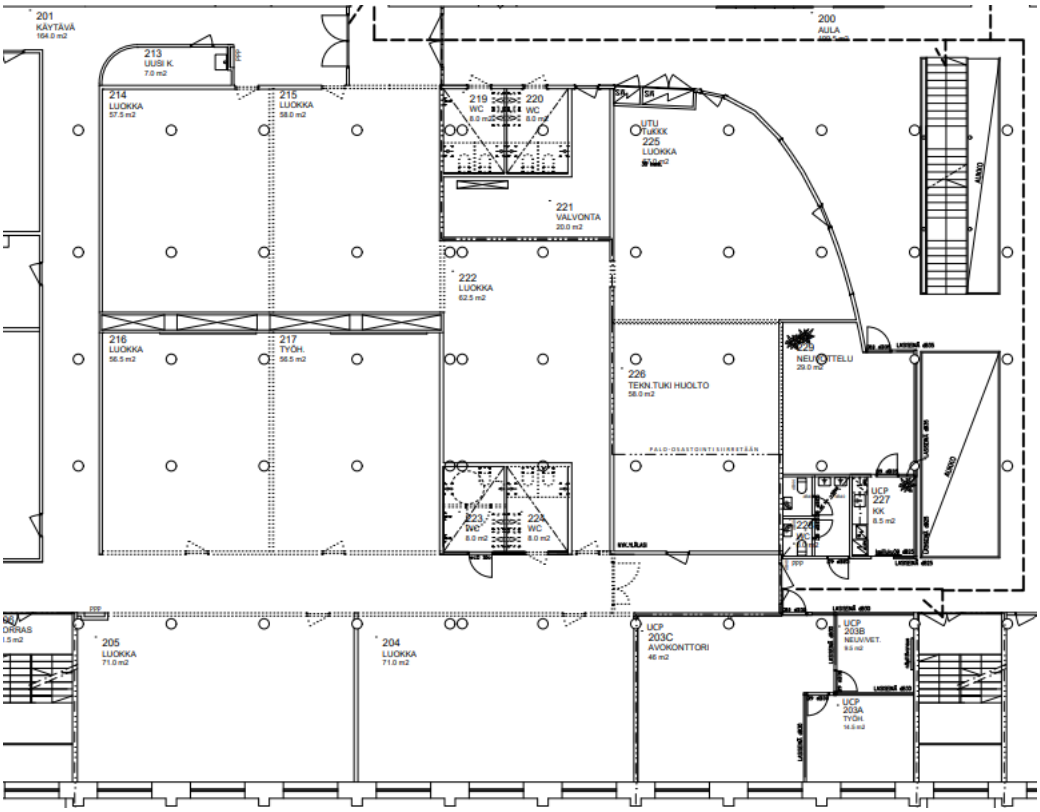

Lohko 4 työmaa-alue → Block 4 working area

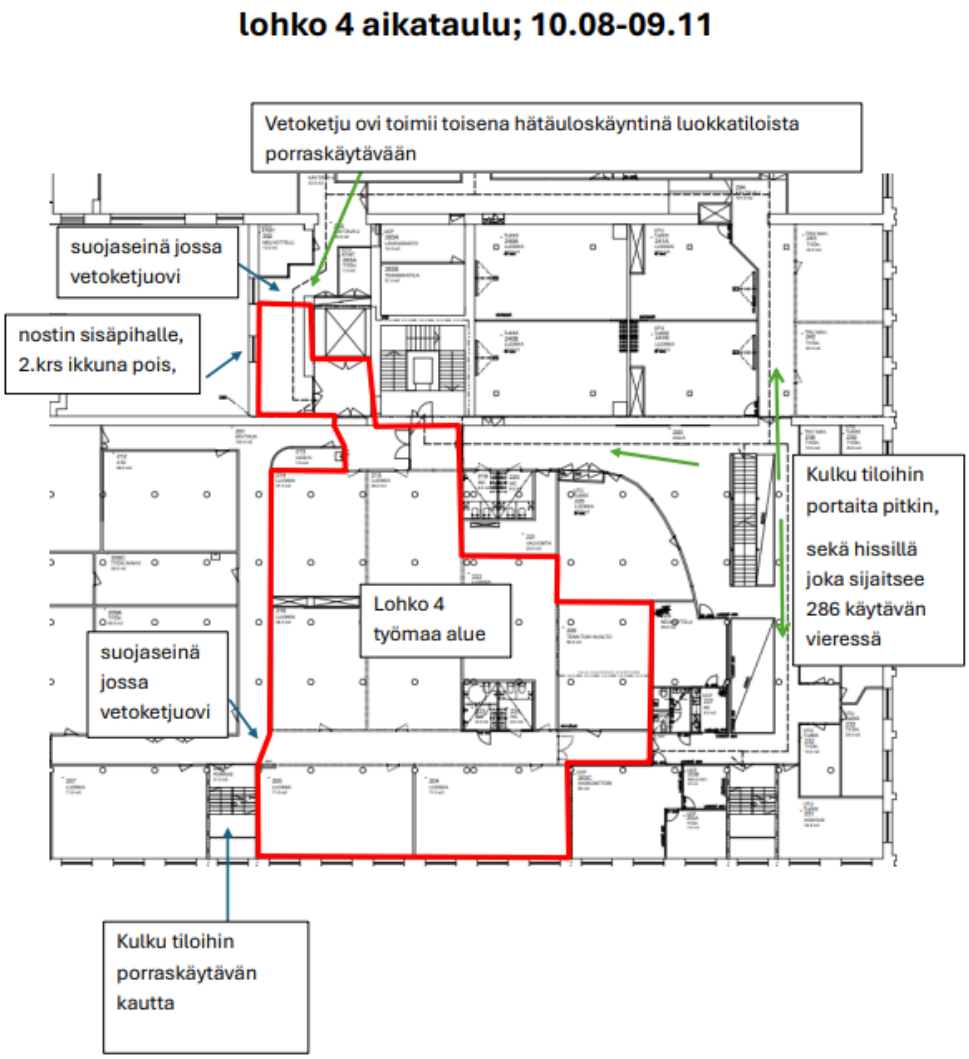

VK 44 tavoitteet – Week 44 goals

Lohko 4 – Block 4

- Sähkötöiden jatkuminen → Continuation of electrical works
- Maalaustöiden jatkuminen → Continuation of painting works
- Laatoitustöiden jatkuminen → Tiling works continue
- Lattiatasoitukset alkavat 26.10 → Floor levelling works will begin on 26 October

Lohko 5 – Block 5

- Sähkötöiden jatkuminen → Electrical works continue
- Levytys työn valmistuminen → Completion of plasterboard installation

Lohko 6 – Block 6

- Purkutöiden jatkuminen → Demolition works continue
- Seinien levytys työt alkavat → Wall boarding works will begin.
- Sähkötöiden aloitus → Starting of electrical works
