Liitteessä Porin yliopistokeskuksen tilauudistustiedote vko 42/2026.

Löydät kaikki viikkoviestit Porin yliopistokeskuksen sivuilta ucpori.fi/tilauudistus .

HUOM! Sivulla 7 mainittu kulku Pohjoisranta 11C ulko-ovesta tarkoittaa yliopistokeskuksen osalta kulkua ainoastaan kolmanteen kerrokseen sekä ensimmäisen kerroksen luokkatiloihin eli ns. ”väistöluokkiin” 107, 108, entinen kirjasto 109 ja exam-luokka 123.

MUUTA YLEISTÄ/AJANKOHTAISTA TILAUUDISTUKSESTA:

- Lohko 3 valmistuu ensi viikolla. Tilat kalustetaan ja varustellaan, jonka jälkeen ne ovat käytettävissä ma 26.10.2026 alkaen.

- 3. kerroksen henkilökunta voisi alkaa valmistautumaan tulevaan muuttoon siivoamalla omaa työpistettään. 3. kerroksen käytäville on toimitettu jäteastioita (tietosuoja-, keräyspaperi ja sekajäte). Astioiden täyttymisestä ja uusien astioiden tai muuttolaatikoiden tarpeista voi ilmoittaa palvelukeskukseen.

- Opiskelijoille tiedoksi:

1. Pääaulan ja kirjaston monitoimitilan välinen lasiväliseinä tullaan sulkemaan opiskelurauhan parantamiseksi. Lasiseinän sulkemisen jälkeen kulku kirjaston ovesta, joka on auki joka päivä klo 8-21.
2. Lasiväliseinään on lisätty väliaikainen huomioteippaus turvallisuuden varmistamiseksi.
3. Opetustiloja voi käyttää silloin, kun niissä ei ole opetusta. Mikäli tilan ovi on lukossa, pyydä ovenavausta palvelukeskuksesta (arkisin klo 8-16).
4. Lukitusjärjestelmän uudistamisen vuoksi pääsy kaikkiin tiloihin ei ole vielä mahdollista.
5. Ensimmäisen kerroksen tilat 107, 108 ja 109 ovet pidetään lukitsematta opiskelijoiden käyttöä varten silloin, kun niissä ei ole opetusta.
6. Monitoimitilan neljän hengen neuvottelukoppien ilmanvaihdon riittävyydestä saadun palautteen perusteella asiasta on tehty reklamaatio toimittajalle. Neuvottelukopeissa on automaattinen ilmanvaihto.
7. Aulan kalustetoimitukset ovat viivästyneet ja osa kalusteista saapuu ensi viikon aikana. Kalusteiden valinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota ergonomiaan.
8. Ergonomian parantamiseksi osaan opetustiloista on hankittu ergonomisemmat tuolit.

Kulku Exam-luokkaan 123 ma 19.10 alkaen

- Arkisin klo 8-16, pääovien kautta. Examin ovi auki arkisin klo 8-16.
- Iltaisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin vain Pohjoisranta 11C oven ja entisen kirjaston 109 kautta vanhalla henkilökohtaisella avaimella tai laina-avaimella. Laina-avaimen voi tarvittaessa noutaa henkilökohtaisesti palvelukeskuksesta arkisin klo 8-16 (henkilöllisyystodistus mukaan).

- Syyslomien vuoksi ensi viikolla ilmestyy pelkkä työmaatiedote.

-Mukavaa viikonloppua! 😊

Attached is the University Consortium of Pori's facility renovation update for week 42/2026.

You can find all weekly updates on the University Consortium of Pori's website: ucpori.fi/tilauudistus.

NOTE! Access via the Pohjoisranta 11C entrance (mentioned on page 7) is limited to the third floor and the first-floor classrooms—specifically the so-called "temporary classrooms" 107, 108, the former library space 109 and exam-room 123.

OTHER GENERAL INFORMATION/UPDATES REGARDING THE RENOVATION:

- Section 3 will be completed next week. The premises will be furnished and equipped, after which they will be available for use starting Monday, October 26, 2026.

- Staff on the 3rd floor can begin preparing for the upcoming move by tidying up their own workstations. Waste bins (for confidential documents, waste paper, and general waste) have been placed in the 3rd-floor corridors. Please notify the Service Center if the bins become full or if you need additional bins or moving crates.

- Information for students:

1. The glass partition between the main lobby and the library's multi-purpose space will be closed to ensure a quieter study environment. Once the glass partition is closed, please use the library entrance, which is open daily from 8:00 to 21:00.

2. Temporary high-visibility tape has been applied to the glass partition to ensure safety.

3. Teaching spaces may be used when no classes are being held in them. If a door is locked, please request to have it opened at the Service Center (weekdays, 08:00–16:00).

4. Due to an upgrade to the locking system, access to all premises is not yet possible.

5. On the first floor, rooms 107, 108, and 109 will be left unlocked for student use whenever they are not being used for teaching. 6. Following feedback regarding the adequacy of ventilation in the four-person meeting pods located in the multi-purpose space, a formal complaint has been lodged with the supplier. The meeting pods are equipped with an automatic ventilation system.

7. The delivery of furniture for the lobby area has been delayed; some of the items will arrive next week. Particular attention was paid to ergonomics when selecting the furniture.

8. To improve ergonomics, more ergonomic chairs have been acquired for some of the teaching spaces.

Access to Exam room 123 – from 19 October à

-Weekdays 08:00–16:00: via the main doors. The Exam room door is open on weekdays from 08:00 to 16:00.

-Evenings (after 16:00) and weekends: access is available only via the entrance at Pohjoisranta 11C and the former library (room 109), using your personal key or a borrowed key. If needed, a key can be borrowed in person from the Service Centre on weekdays between 08:00 and 16:00 (please bring an ID).

- Due to the autumn break, only a site update bulletin will be issued next week.

-Have a nice weekend! 😊


112 UCPORI – tilamuutos 2026




VK 42

- Lohko 3 – Block 3
  - Siivoustyöt käynnissä → Cleaning works in progress
  - Listoitus ja viimeistelyt käynnissä → Skirting installation and finishing works in progress
  - Kalustus käynnissä → Furniture installation in progress
- Lohko 4 – Block 4
  - Maalaustyöt 50 % → Painting works 50% completed
  - Levytys työt saatu valmiiksi → Plasterboard installation completed
  - sähkötyöt käynnissä → Electrical works in progress

  - Laatoitus tiloissa käynnissä → Tiling works in progress
- Lohko 5 – Block 5
  - Purkutyöt valmistuneet → Demolition works completed
  - Seinien levytys työt jatkuvat → Wall plasterboard installation works continue
  - Sähkötyöt jatkuvat → Electrical works continue
- Lohko 6 – Block 6
  - Purku työt käynnissä → Demolition works in progress

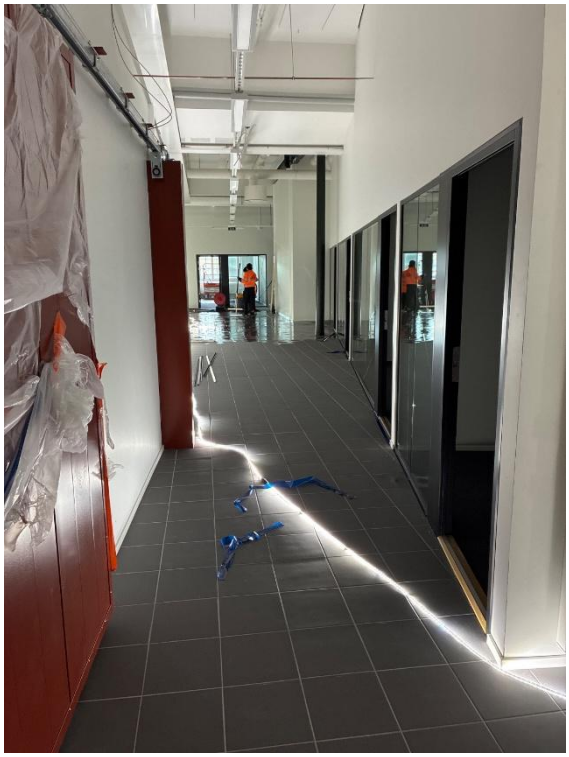

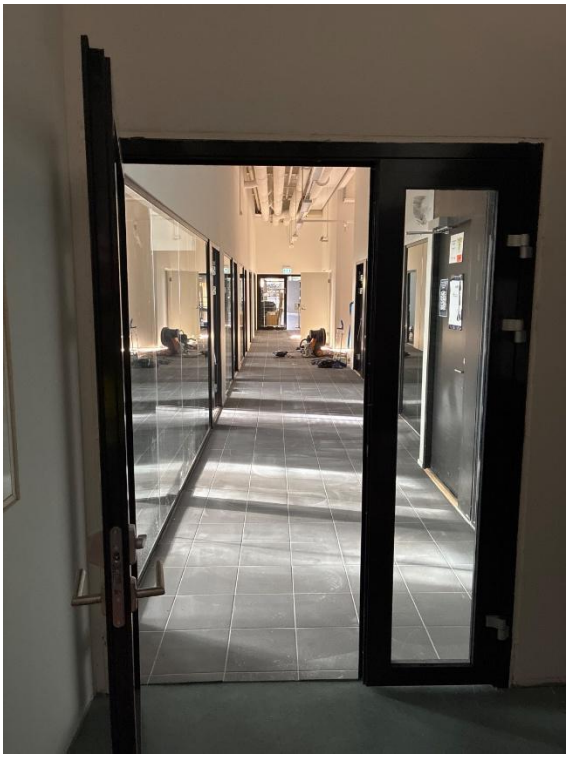

Siivoustyöt käynnissä lohko 3 → Cleaning works in progress








Lohko 4 valmista maalauspintaa sekä wc tilojen laatoitus käynnissä. Käytävätilan laatoituksen valmistelut käynnissä → Block 4 painting works partially completed, and tiling works in the WC areas are in progress. Preparations for corridor floor tiling are underway.


Lohkojako 1.krs → Block division – 1st floor

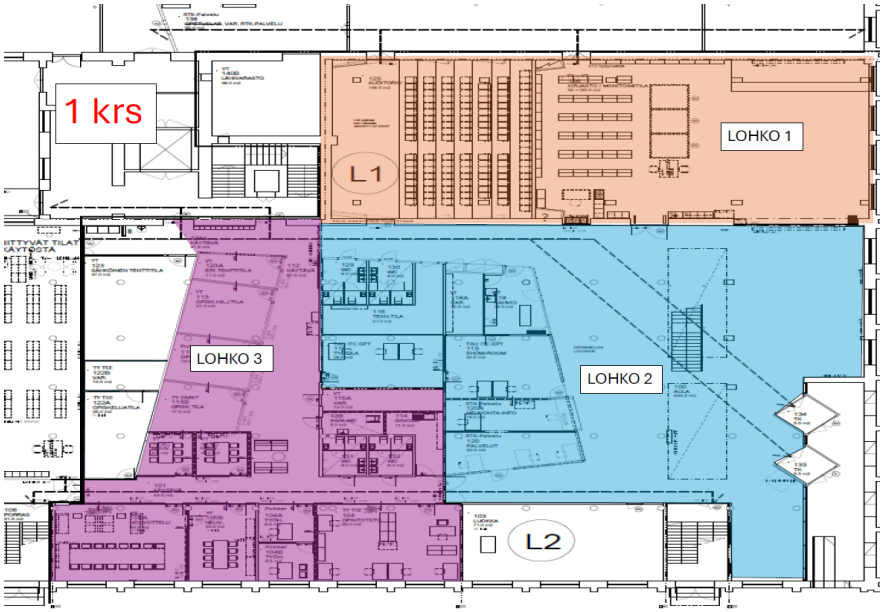


Lohkojako 2.krs → Block division second floor



Lohko 4:n purkukuva → Block 4 demolition layout

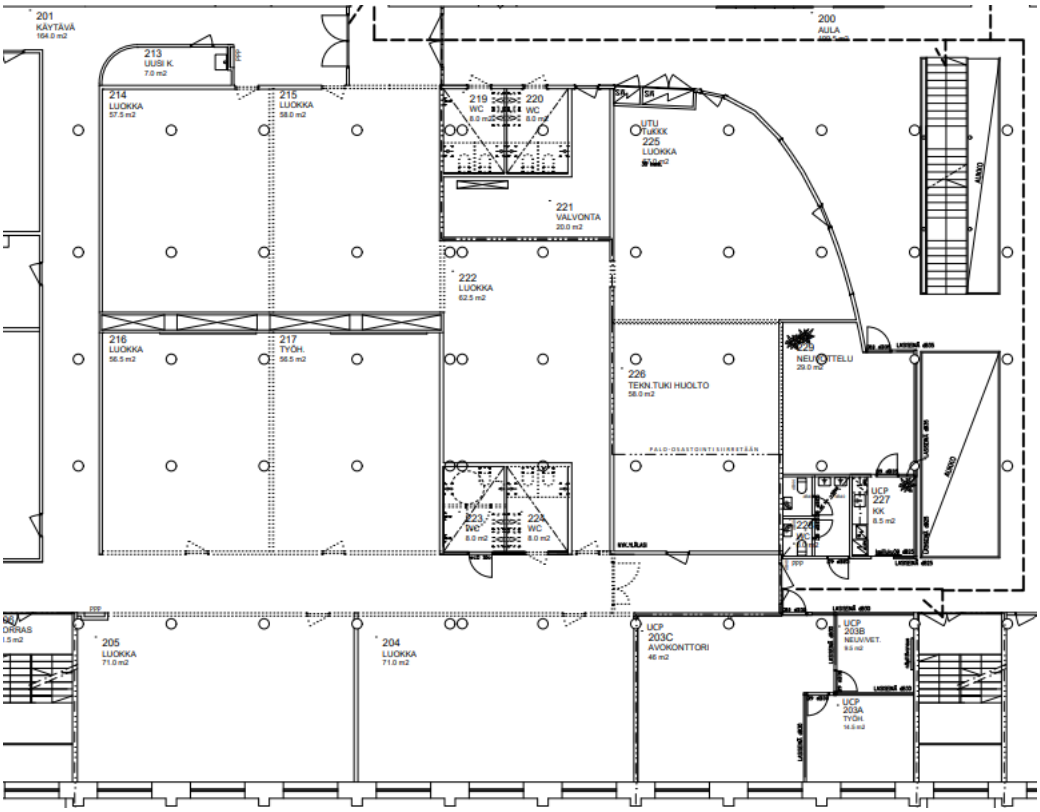

Lohko 4 työmaa-alue → Block 4 working area

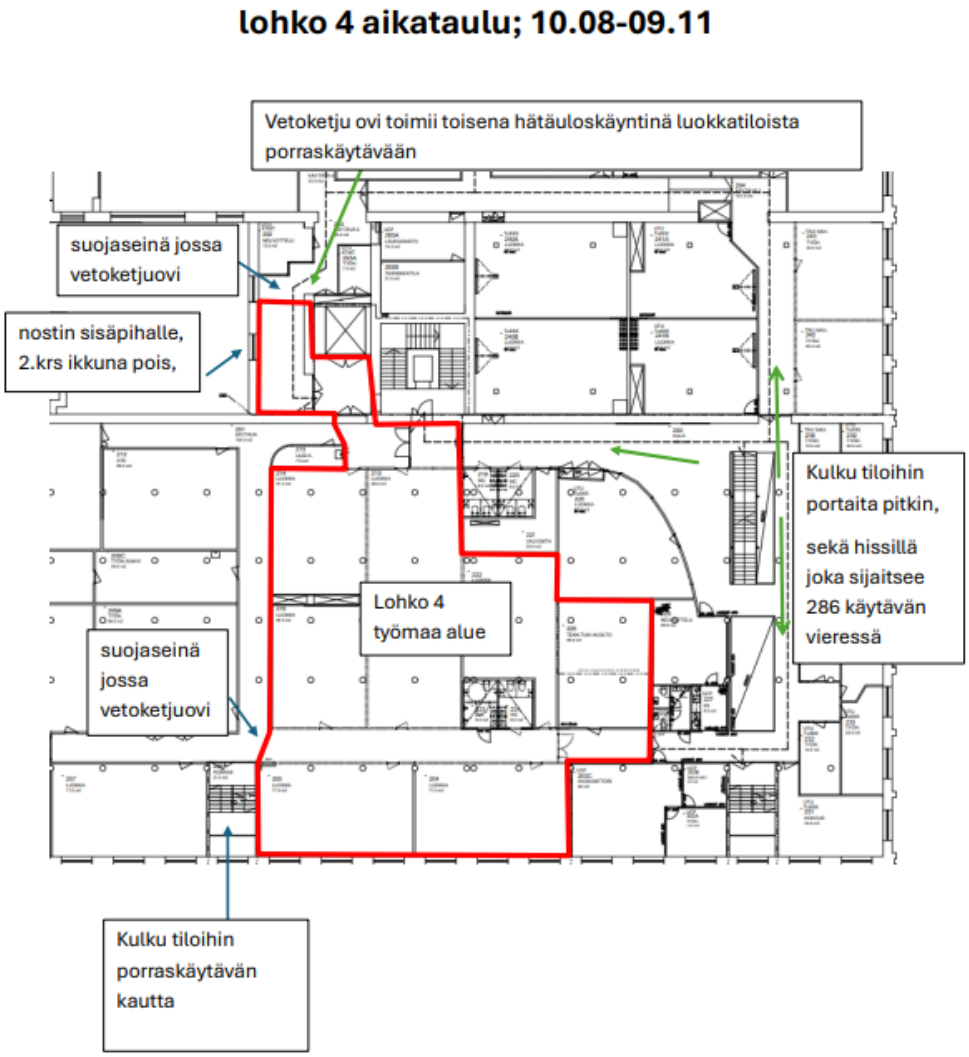

VK 43 tavoitteet – Week 43 goals

Lohko 3 – Block 3

- Tilojen luovutus käyttäjille → Handover of the completed areas to the users

Lohko 4 – Block 4

- Sähkötöiden jatkuminen → Continuation of electrical works
- Maalaustöiden jatkuminen → Continuation of painting works
- Laatoitustöiden jatkuminen → Tiling works continue

Lohko 5 – Block 5

- Sähkötöiden jatkuminen → Electrical works continue
- Levytys työn valmistuminen → Completion of plasterboard installation

Lohko 6 – Block 6

- Purkutöiden jatkuminen → Demolition works continue

Sähkökatko 15.10.2026

Tänään 15.10. lohkon 3 alueella on ollut sähkökatko sähkökeskuksen muutostöiden vuoksi. Sähkökatkon vaikutuksia arvioitaessa emme olleet huomioineet aiemmin käyttöön luovutettua Exam-tenttitilaa emmekä vanhaa kirjastotilaa, minkä vuoksi tiedottaminen jäi puutteelliseksi. Sähköurakoitsija oli vain laputtanut ovet, että ovat poissa käytöstä.

Pahoittelemme tapahtunutta ja siitä aiheutunutta haittaa. Otamme vastuun virheestä ja kiinnitämme jatkossa erityistä huomiota katkojen vaikutusalueisiin sekä ennakkotiedottamiseen, jotta vastaavilta tilanteilta vältytään.

Ystävällisin terveisin työmaan projektinjohto Teemu ja Matti.

Today, 15 October, a power outage occurred in Block 3 due to modifications to the electrical distribution board.

When assessing the impact of the outage, we failed to take into account the Exam room, which had previously been handed over for use, and the former library area. As a result, the advance communication was insufficient. The electrical contractor had only placed notices on the doors indicating that the rooms were out of use.

We apologize for the incident and any inconvenience caused. We take responsibility for the oversight and will pay closer attention to the areas affected by future power outages and ensure better advance communication to prevent similar situations.

Kind regards,

Site Project Management

Teemu and Matti
